

Esclarecimentos Complementares – CETAS DF
Cartas-Convites nº 209/2026, 213/2026 e 214/2026

Serviço de Pessoa Jurídica para fornecimento, adaptação e instalação de 3 (três) contêineres modulares em atendimento a 3 (três) CETAS, a saber: Distrito Federal (DF), Lorena (SP) e Seropédica (RJ).

1. Escopo:

Devido a distâncias geográficas e logística necessária, expressamos interesse em fornecer os equipamentos modulares para as unidades de **Brasília - DF, Lorena - SP e Seropédica - RJ**. Porém, gostaríamos de averiguar a possibilidade de atendermos o escopo global de Brasília - DF e fornecer os equipamentos para Lorena - SP e Seropédica - RJ, de forma que a infraestrutura no local (limpeza, movimentação de solo, fundação, execução das instalações hidráulicas e elétricas, interligações com as redes, entre outros) seja fornecida por outro prestador de serviço.

2. Piso:

Pergunta 1: Podemos considerar aplicação de **manta vinílica hospitalar** em todos os equipamentos?

Resposta 1: Em relação ao módulo que virá para o Cetas-DF, confirmamos que pode sim ser aplicado manta vinílica hospitalar.

3. Instalações elétricas.

Pergunta 2.1: (Brasília - DF) Para fins de orçamento, necessito da informação do posicionamento e distância da interligação de elétrica no terreno, para que eu dimensione as conexões necessárias para a instalação do módulo.

Resposta 2.1: A interligação elétrica mais próxima necessita 150 metros de fio, sendo 50 metros de fio verde, 50 metros de fio azul e 50 metros de fio preto. Ademais, são necessários 50 metros de conduíte reforçado de 1 polegada e uma bitola de 6mm.

Pergunta 2.2: A instalação elétrica interna do módulo deve ser embutida ou de sobrepor? Caso seja possível ser de sobrepor, os eletrodutos podem ser de PVC ou de aço galvanizado, qual a melhor opção?

Resposta 2.2: A instalação elétrica interna do módulo deve ser preferencialmente embutida, mas se não for possível, pode ser de sobrepor com eletrodutos de aço galvanizado.

Pergunta 2.3: Gostaríamos de avaliar a possibilidade da substituição da caixa blindada externa por uma tomada industrial tipo Steck, fêmea, para conexão. Podemos considerar no nosso orçamento?


Resposta 2.3: Sim, desde que a instalação e ligação elétrica na tomada Steck também seja feita pela própria empresa.

4. Rede Lógica

Pergunta 3: Para fins de orçamento, necessito da identificação do local do Hack que será instalado no módulo e do ponto de rede que fará a conexão do sistema geral de cada unidade.

Resposta 3: Para fins de esclarecimento quanto ao Hack instalado e demais posicionamentos dentro do container, apresentamos, abaixo, figura ilustrativa de como pretendemos organizar o espaço no Cetas-DF. Não há preferência pelo local de instalação de ponto de rede.

Figura 1: Layout ilustrativo dos contêineres, apresentado apenas como referência da organização funcional pretendida pelo beneficiário, não substituindo o projeto.

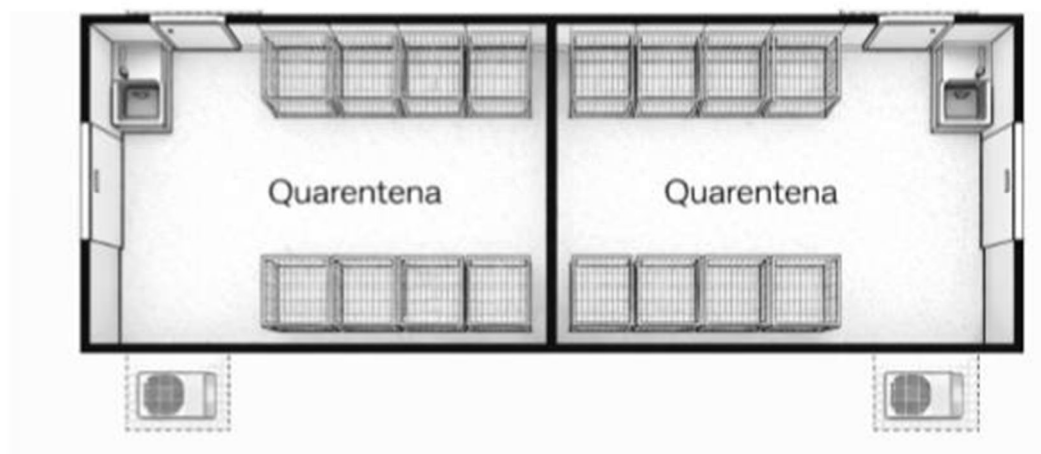

5. Hidrossanitário (Brasília - DF)

Pergunta 4: Para fins de orçamento, necessito da informação do posicionamento e distâncias das interligações de água e esgoto no terreno, para que eu dimensione as conexões necessárias para a instalação do módulo.

Resposta 4: A interligação hidráulica mais próxima necessita de 37 metros de cano 25, 1 "T" de 25/25, 2 curvas/joelhos e um registro de 25/25.
