

# Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ


---

Relatório de Cumprimento do Objeto conforme atendimento das  
atividades pactuadas no Convênio 003/2009

Período de 30 de março de 2010 a 31 de dezembro de 2015

Rio de Janeiro

Junho de 2016

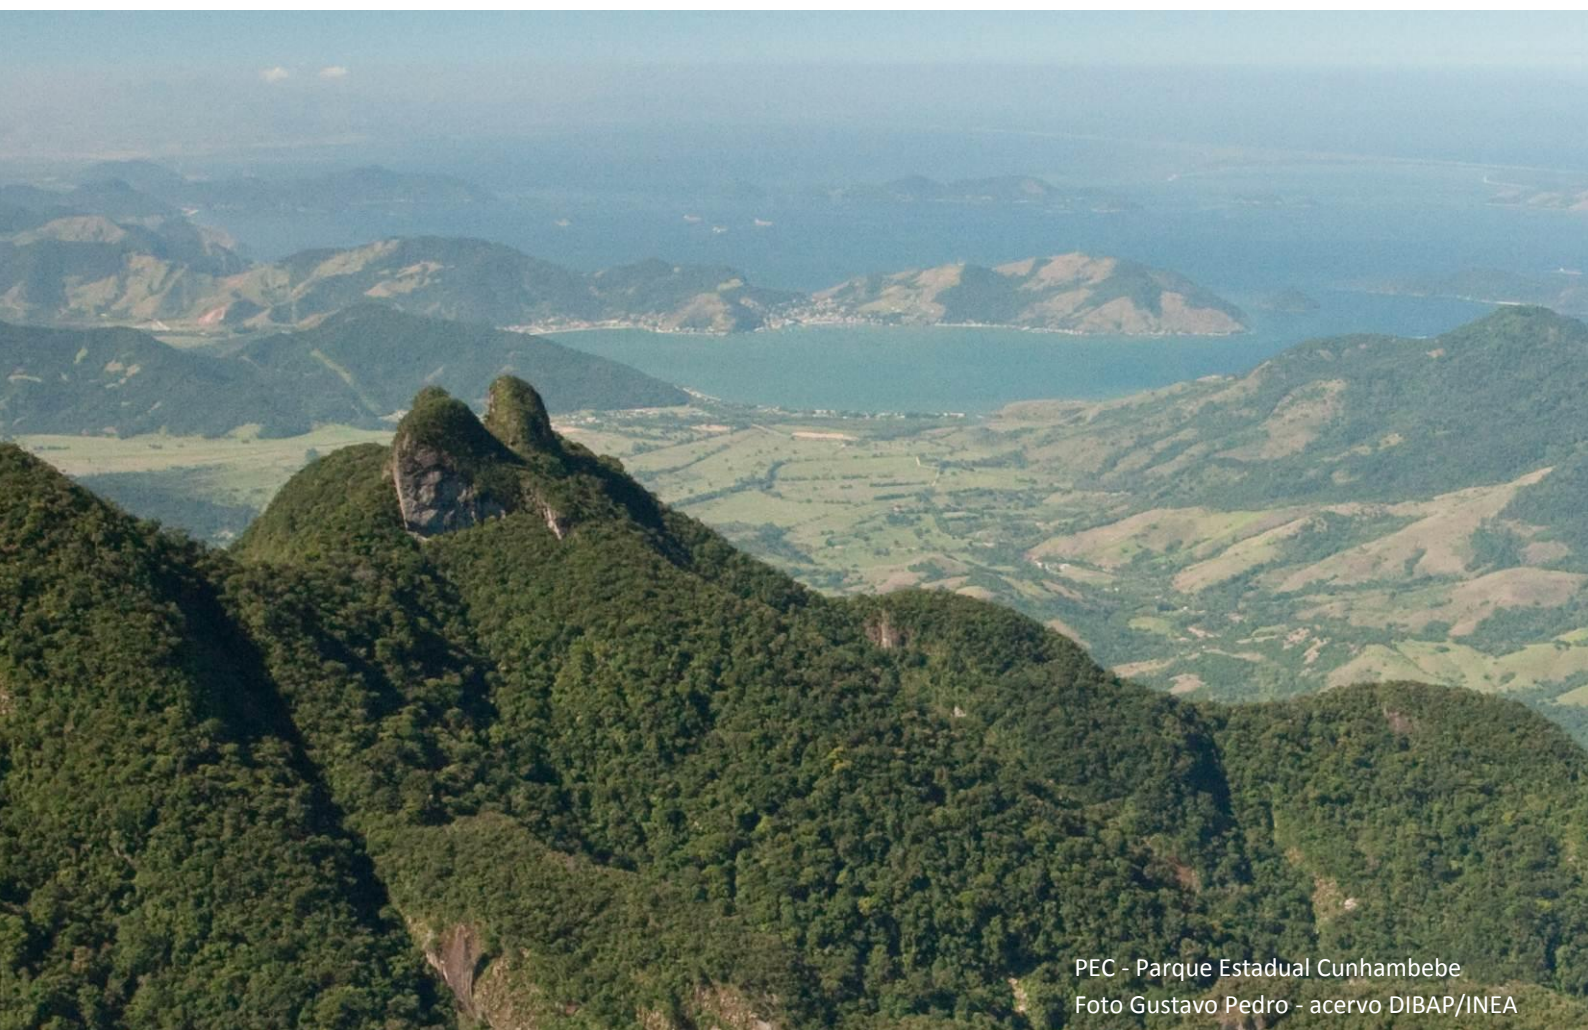

PEC - Parque Estadual Cunhambebe  
Foto Gustavo Pedro - acervo DIBAP/INEA



## **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar

Rio de Janeiro, RJ 22270-014 – Brasil

Tel: (+55) (21) 2123-5300

[www.funbio.org.br](http://www.funbio.org.br)

[funbio@funbio.org.br](mailto:funbio@funbio.org.br)

### **Equipe do FMA/RJ no Funbio responsável pela elaboração do relatório**

Erika Polverari Farias

Natalia Prado Paz

Laura Pires Petroni

Mary Teixeira

Marilene Viero

Luis Fernando Farah

Flávia Neviani

Coordenadora da Unidade de Obrigações Legais

Gerente do Projeto

Assistente do Projeto

Assistente do Projeto

Controle Financeiro do Projeto

Assistente Financeiro do Projeto

Assessora Jurídica

### **Contatos**

Natalia Prado Paz – [gerencia.fma@funbio.org.br](mailto:gerencia.fma@funbio.org.br)

Tel: (+55) (21) 2123-5323 / 2123-5383 / 2123-5324

**A missão do Funbio é aportar recursos estratégicos  
para a conservação da biodiversidade**

## Sumário

<b>SOBRE O CONVÊNIO .....</b>	<b>5</b>
<b>I. QUANTO À ENTRADA DE RECURSOS POR FORÇA DO CONVÊNIO: .....</b>	<b>9</b>
1.1 INSTRUMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL .....	9
1.2 INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO.....	16
1.3 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE OUTRAS FONTES .....	19
1.4 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE DOAÇÃO.....	21
1.5 QUADRO RESUMO COM AS ENTRADAS DE RECURSOS POR ANO.....	21
<b>II. RENDIMENTOS DOS SEGUINTE INSTRUMENTOS: .....</b>	<b>22</b>
2.1 INSTRUMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL .....	22
2.2 INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO.....	27
2.3 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE OUTRAS FONTES .....	32
<b>III. QUANTO À EXECUÇÃO POR TCCA, COM DETALHAMENTO POR PROJETOS:.....</b>	<b>33</b>
3.1 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CSA 2 (THYSSEN) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	34
3.2 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA COMPERJ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	43
3.3 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA GASDUC III (TAG) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	46
3.4 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA GASODUTO JAPERI REDUC - GASJAP ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	47
3.5 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA GROTA FUNDA TRANSOESTE (PMRJ) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	48
3.6 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PORTO DO AÇÚ (LLX) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ...	49
3.7 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO INFRA. URB. COMPERJ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	51
3.8 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA UTE BAIXADA FLUMINENSE PETROBRAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	53
3.9 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA VIA PRINCIPAL DE ACESSO - COMPERJ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	54
3.10 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT – INFRAERO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	55
3.11 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇÚ (OSX) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	57
3.12 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA TERMINAL MARÍTIMO DA ILHA GUAÍBA - VALE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	59
3.13 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CTR ITABORAÍ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	60

3.14	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA OBRAS TECAB ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	61
3.15	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PONTA DA AREIA MAC LAREN ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	62
3.16	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA TRANSOLÍMPICA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	63
3.17	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA METRO (CRB) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	64
3.18	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA TA AR TRANSPETRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	65
3.19	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA ITAGUAÍ TECAR ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	66
3.20	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA METRO CRB II ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	67
3.21	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PRESIDENTE VARGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	68
3.22	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PCH PARACAMBI ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	69
3.23	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CTR SR (SERB) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	70
3.24	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA QUITUMBA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	71
3.25	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA UTE SANTA CRUZ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	72
3.26	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA AMPLIAÇÃO CTR SAHY BRASCAN ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	73
3.27	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA UTE MARINA IMPERIAL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	74
3.28	EXECUÇÃO RELATIVA AO PROJETO FUNDO FIDUCIÁRIO:.....	75
3.29	EXECUÇÃO RELATIVA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA:.....	76
3.30	SITUAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA OS PROJETOS: .....	80
<b>IV.</b>	<b>QUANTO AO REEMBOLSO FUNBIO .....</b>	<b>88</b>
<b>V.</b>	<b>QUANTO À TIPOLOGIA DOS PROJETOS APOIADOS .....</b>	<b>107</b>
<b>VI.</b>	<b>QUANTO ÀS UCs APOIADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .....</b>	<b>108</b>
<b>VII.</b>	<b>RESUMOS DOS RESULTADOS ATINGIDOS:.....</b>	<b>112</b>

## Relatório de Cumprimento do Objeto conforme atendimento das atividades pactuadas no Convênio 003/2009

---

O presente relatório vem informar sobre a execução do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental e a alocação dos recursos para o Instrumento Financeiro Fiduciário como meio para a implantação, consolidação e sustentabilidade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

### Sobre o Convênio

#### **Concepção do Mecanismo objeto do Convênio:**

O Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro foi concebido com o objetivo de captação e otimização/eficácia de gestão das diversas fontes de recursos disponíveis para aplicação na conservação da biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro, em sede de contrato de prestação de serviços 023/2007 celebrado entre a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, que contemplou o período piloto para a gestão do Mecanismo. Diante do sucesso da concepção e gestão do piloto foi celebrado o Convênio 003/2009.

**Duração:** O convênio foi assinado em 29 de dezembro de 2009 e publicado no DOERJ em 12 de janeiro de 2010 com duração de 3 (três) anos. Foi prorrogado por mais 3 (três) anos por aditivo assinado em 10 de janeiro de 2013 e publicado no DOERJ em 16 de janeiro de 2013. Prazo até 16 de janeiro de 2016. Celebrado o 4º Termo Aditivo, estabelecendo a prorrogação do prazo para 14 de novembro de 2016 e os procedimentos para o encerramento do Convênio.

**Abrangência Geográfica:** Bioma da Mata Atlântica

**Valor:** No âmbito desse convênio não está previsto o repasse de recursos públicos. Os recursos geridos pelo Funbio no âmbito do convênio, até o presente, são provenientes de obrigações das compensações ambientais previstas no artigo 36 da lei do SNUC, direcionados ao mecanismo pelos empreendedores. São também consideradas possíveis outras fontes de recursos, tais como, doações, medidas compensatórias, entre outras.

#### **Arranjo institucional do projeto**

Os recursos do Mecanismo Financeiro para a Conservação da Biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro, advindos de compensação ambiental, doações e outras fontes, são direcionados pelo CONVENENTE à execução de projetos de conservação dos recursos naturais e da biodiversidade em Unidades de Conservação, seu entorno e outras áreas

protegidas localizadas no Estado do Rio de Janeiro conforme determinado pela SEA/RJ e de acordo com a aprovação de projetos pelas competentes instâncias deliberativas, em conformidade com os Termos de Cooperação Técnica celebrados entre o Funbio e os órgãos ambientais executores, com a interveniência da SEA/RJ, e de acordo com as etapas e prazos estabelecidos nos planos de trabalho e cronogramas físico financeiros dos projetos aprovados, sempre observando as regras estabelecidas nos Manuais Operacionais dos respectivos instrumentos operacionais e financeiros.

**Parceiros:** Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, Secretaria de Estado do Ambiente – SEA/RJ e Instituto Estadual do Ambiente – INEA/RJ.

### **Objetivos e componentes**

O convênio assinado tem como objetivo a gestão do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) compreendendo a gestão pública quanto à aplicação/destinação dos recursos e a gestão privada financeira e operacional contemplando a manutenção e controle da aplicação dos recursos disponíveis para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Esse instrumento foi instituído para aplicar recursos de compensação ambiental sob governança pública, além de doações e captações de outras fontes, estes com aplicação pactuada, respectivamente, com doadores e investidores.

O Mecanismo FMA/RJ é composto por quatro instrumentos operacionais e financeiros, a saber:

1. **Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental:** mecanismo operacional e financeiro destinado à aplicação dos recursos de compensação ambiental, em que o empreendedor, após adesão voluntária selada mediante assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental celebrado com o órgão ambiental licenciador, e posterior anuência da SEA e do INEA (deste último quando o órgão ambiental licenciador for outro que não o INEA), deposita os recursos em conta do Funbio para execução de projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental (CCA/RJ), subdividido em duas formas de aplicação:
  - a. *Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ:* instrumento destinado à execução de projetos apresentados por órgãos municipais, estaduais e federais de meio ambiente, assim como aqueles destinados à gestão de reservas particulares do patrimônio natural, e aprovados pela CCA/RJ, que tenham sinergia com a Política Estadual de Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro e atendam aos requisitos da Lei nº 9985/2000 e de seu decreto regulamentador.



b. *Reserva de Regularização Fundiária*: reserva de recursos destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O pagamento das desapropriações é liberado somente após decisão judicial, ou por meio de acordo judicial ou administrativo.

2. **Instrumento Operacional e Financeiro de Doação**: mecanismo operacional e financeiro destinado à aplicação de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e conservação da biodiversidade, aprovados pelos órgãos ambientais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do Mecanismo FMA/RJ.

3. **Instrumento Financeiro Fiduciário**: mecanismo operacional e financeiro destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental a longo prazo, com intenção de garantir sustentabilidade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro. O direcionamento de recursos provenientes de compensações ambientais a este instrumento ocorre quando deliberado pela Câmara de Compensação Ambiental<sup>1</sup>. Os rendimentos líquidos dos recursos deste instrumento são aplicados na manutenção de Unidades de Conservação Estaduais do Rio de Janeiro<sup>2</sup>.

4. **Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes**: mecanismo operacional e financeiro destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental e cuja origem não seja nem de compensação ambiental, nem doações diretas nacionais ou internacionais. Previsto como possível no desenho do Mecanismo Financeiro para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) será desenvolvido quando identificadas as fontes de recursos a serem a eles direcionados. Este instrumento poderá abrigar recursos oriundos de condicionantes de licença ambiental, termos de ajuste de conduta e outras fontes que venham a ser identificadas.

---

<sup>1</sup> 29ª, 31ª, 34ª, 35ª, 36ª, 39ª, 40ª, 42ª, 48ª e 53ª Reuniões Ordinárias da CCA.

<sup>2</sup> Os recursos do Instrumento Financeiro Fiduciário são direcionados para uma conta bancária específica e são investidos de acordo com a política de investimentos aprovada pela SEA/RJ, supervisionados pelo Funbio sob a orientação da Comissão de Gestão de Ativos instituída no âmbito do Conselho Deliberativo do Funbio.

## **Estrutura legal do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ)**

A operação do Mecanismo FMA/RJ se dá em conformidade com as atribuições das partes no Convênio (Funbio, SEA/RJ e INEA/RJ); o Plano de Trabalho (Anexo ao Convênio - composto do Manual Operacional do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, de Faixas limites dos Custos Funbio e Cronograma de Atividades, elaborados pelo Funbio e chancelados pelas partes), os Termos de Cooperação Técnica ou Termos de Reciprocidade, celebrados entre o Funbio e os órgãos ambientais beneficiários dos projetos (INEA, ICMBio ou Municípios) com a interveniência da SEA, os Termos de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA/RJ firmados entre o empreendedor e o órgão licenciador, e os projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ, a serem financiados com recursos de compensação ambiental, nos termos do art. 36 da Lei 9.985/2000 (Lei do SNUC), de empreendedores que optaram por adotar o Mecanismo FMA/RJ.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, examinou projeto de lei proposto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e promulgou, em 2013, a Lei nº 6.572 que dispõe sobre a compensação devida pelo empreendedor responsável por atividade de significativo impacto ambiental. A Lei nº 6.572/2013 institui claramente a possibilidade da opção do empreendedor, relativa ao empreendimento, por executar diretamente esse recurso, ou por contratação de terceiros sob sua responsabilidade ou ainda por mecanismos operacionais e financeiros implementados pela SEA/RJ, onde o Mecanismo FMA/RJ se insere.



## I. Quanto à entrada de recursos por força do convênio:

### 1.1 Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O montante de recursos total esperado para entrada neste instrumento, considerando os valores discriminados nos Termos de Compromisso de Compensações Ambientais - TCCAs assinados com 66 empreendedores que optaram pelo Mecanismo FMA/RJ, já enviados pela Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILAM/INEA/SEA/RJ para o Funbio é de R\$ 257.584.889,85 (duzentos e cinquenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), sendo o total de valores recebidos até 31 de dezembro de 2015 de R\$ 234.181.463,68 (duzentos e trinta e quatro milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme pode ser observado na tabela abaixo.

	Empreendedor	Empreendimento	TCCA	INÍCIO dos Depósitos no Funbio	Valor do TCCA <sup>3</sup>	Recursos Recebidos <sup>4</sup>	Recursos a receber
1	Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A	Lot. Búzios Golfe (Agre)	013/2013	21/01/2014	R\$ 210.000,00	R\$ 212.363,27	R\$ -
2	Bellavista Empreendimentos Ltda	Expansão Bellavista	005/2015	02/02/2015	R\$ 249.950,72	R\$ 104.146,15	R\$ 145.804,61
3	Brascan SPE RJ 5 S/A	Ampliação CTL Sahy - Brascan	002/2011	05/05/2011	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ -
4	Bric Brazilian Intermodal Complex S.A	Bric Brazilian	003/2013	14/06/2013	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ -

<sup>3</sup> Devido aos termos aditivos ao TCCAs/RJ, os rendimentos dos recursos ou às correções monetárias, existem empreendimentos cujos recursos recebidos foram maiores do que os valores firmados nos TCCAs.

<sup>4</sup> Recursos recebidos até 31 de dezembro de 2015.

5	Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí - LTDA	CTR Itaboraí	011/2009	08/08/2011	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ -
6	Companhia Siderúrgica Nacional	Presidente Vargas - CSN	013/2012	13/12/2012	R\$ 900.000,00	R\$ 902.001,98	R\$ -
7	Companhia Siderúrgica Nacional	Itaguaí Tecar CSN II	015/2012	07/03/2013	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ -
8	Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A - CCR Nova Dutra	CCR Dutra	006/2013	10/07/2013	R\$ 1.620.265,77	R\$ 1.350.221,40	R\$ 20.044,34
9	Concessionaria Rio Barra S/A	Metro (CRB)	001/2010	19/05/2010	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ -
10	Concessionaria Rio Barra S/A	Metro (CRB) II	006/2012	23/08/2012	R\$ 7.845.000,00	R\$ 7.845.218,04	R\$ -
11	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont	Aeroporto Santos Dumont - Infraero	013/2009	27/06/2012	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ -
12	Furnas Centrais Elétricas S.A.	UTE Santa Cruz - Furnas	006/2014	06/11/2014	R\$ 630.820,25	R\$ 967.525,48	R\$ -
13	Furnas Centrais Elétricas S.A.	LT Macaé Campos III- Furnas	009/2014	09/02/2015	R\$ 296.772,80	R\$ 462.261,79	R\$ -
14	Libra Terminal Rio S.A	Libra Terminal	001/2012	13/03/2012	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.070.577,67	R\$ -
15	LIGHTGER S/A	PCH Paracambi (Lightger)	028/2008	05/09/2011	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ -
16	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	Porto do Açú (LLX)	012/2009	21/09/2010	R\$ 22.266.725,03	R\$ 19.911.122,60	R\$ 2.357.382,78
17	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	Terminal Sul LLX	011/2012	09/08/2013	R\$ 15.850.973,29	R\$ 5.313.286,61	R\$ 10.542.630,02
18	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	Dragagem do TESUL - LLX	003/2014	06/10/2014	R\$ 5.494.293,78	R\$ 2.290.052,15	R\$ 3.205.004,67

19	Loteum Incorporações S. A.	Loteum	025/2012	22/02/2013	R\$ 188.889,04	R\$ 188.934,13	R\$ -
20	Mac Laren Oil Estaleiros Ltda	Ponta da Areia Mac Laren	003/2009	19/06/2012	R\$ 1.402.297,92	R\$ 545.338,08	R\$ 856.959,84
21	Marina Imperial Ltda	Marina Imperial	016/2013	12/12/2013	R\$ 63.925,75	R\$ 63.925,75	R\$ -
22	Multicar Rio Terminal de Veículos S/A	MULTICAR	004/2013	10/07/2013	R\$ 674.203,64	R\$ 674.203,68	R\$ -
23	Multi-Rio Operações Portuárias S/A	MULTI RIO	005/2013	10/07/2013	R\$ 650.682,14	R\$ 650.682,24	R\$ -
24	OSX Construção Naval S.A.	Construção Naval do Açú (OSX)	005/2011	18/08/2011	R\$ 37.418.678,28	R\$ 32.184.857,32	R\$ 5.239.463,44
25	Petrobrás Transporte S.A - Transpetro	TA AR Transpetro	010/2011	19/11/2012	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ -
26	Petróleo Brasileiro S/A	COMPERJ (Petrobras)	003/2010	16/06/2010	R\$ 41.634.000,00	R\$ 48.341.508,49	R\$ -
27	Petróleo Brasileiro S/A	Implantação Infra. e Urb. Comperj	008/2012	08/08/2012	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ -
28	Petróleo Brasileiro S/A	Via Principal Acesso COMPERJ	001/2011	16/05/2011	R\$ 1.093.116,72	R\$ 1.128.721,59	R\$ -
29	Petróleo Brasileiro S/A	Obras TECAB	008/2011	09/12/2011	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ -
30	Petróleo Brasileiro S/A	UTE Baixada Fluminense	011/2011	03/01/2012	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ -
31	Petróleo Brasileiro S/A	Comperj - Uhos	010/2012	17/08/2012	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.415.862,50	R\$ -
32	Petróleo Brasileiro S/A	Sistema Dutoviário - Comperj	007/2013	16/10/2013	R\$ 3.999.500,00	R\$ 3.999.500,00	R\$ -

33	Petróleo Brasileiro S/A	Terrestre Submarino Emissário - Comperj	002/2013	02/09/2013	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ -
34	Petróleo Brasileiro S/A	Linhas de Transmissão	009/2013	14/10/2013	R\$ 91.450,72	R\$ 91.450,75	R\$ -
35	Petróleo Brasileiro S/A	Gasoduto Guapimirim	008/2013	16/10/2013	R\$ 352.855,55	R\$ 352.855,60	R\$ -
36	Petróleo Brasileiro S/A	Gasoduto Guapimirim II	012/2013	07/01/2014	R\$ 514.870,70	R\$ 514.870,70	R\$ -
37	Petróleo Brasileiro S/A	UPGN COMPERJ	014/2013	16/12/2013	R\$ 9.039.987,39	R\$ 9.039.987,40	R\$ -
38	Petróleo Brasileiro S/A	Readequação Tecam/Reduc	008/2014	06/02/2015	R\$ 1.740.232,51	R\$ 1.740.754,57	R\$ -
39	Petróleo Brasileiro S/A	GNL Petrobras	007/2015	30/09/2015	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.697.114,62	R\$ -
40	Poço Fundo Energia S/A	PCH Rio Petro	007/2014	08/06/2015	R\$ 319.028,27	R\$ 62.033,30	R\$ 256.995,10
41	Porto Sudeste do Brasil LTDA	Ampliação Porto Sudeste	006/2015	18/12/2015	R\$ 4.950.000,00	R\$ 412.500,00	R\$ 4.537.500,00
42	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Grota Funda Transoeste (PMRJ)	008/2010	22/12/2010	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ -
43	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Transolímpica (PMRJ)	001/2013	19/06/2013	R\$ 6.155.193,87	R\$ 6.155.194,96	R\$ -
44	Prefeitura Municipal de Volta Redonda	Aeroporto Volta Redonda	009/2010	30/12/2010	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ -
45	Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A	Quitumba	004/2012	13/06/2012	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ -

46	Rio JV Partners Participações LTDA <sup>5</sup>	Rio JV Partners	014/2012	12/11/2012	R\$ 511.111,16	R\$ 511.111,16	R\$ -
47	São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda	Alphaville São José	004/2014	03/02/2015	R\$ 260.109,47	R\$ 260.109,47	R\$ -
48	SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A	CTR S R (SERB)	002/2010	31/05/2010	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ -
49	Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda	CSA 2 (Thyssen)	011/2007	30/03/2010	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ -
50	Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	Gasjap	013/2007	10/01/2011	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ -
51	Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	GASDUC III	012/2008	22/10/2010	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ -
52	UTE Porto do Açú Energia S/A	UTE Porto do Açú	003/2012	28/05/2012	R\$ 568.308,57	R\$ 568.308,60	R\$ -
53	Vale S/A	Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale	012/2012	25/09/2012	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ -
54	Alphaville Urbanismo S/A	Alphaville Rio - Costa do Sol	Falta TCCA		R\$ 224.325,00	R\$ -	R\$ 224.325,00
55	Departamento de Estradas de Rodagem	Arco Rodoviário - DER	Falta TCCA		R\$ 8.765.541,21	R\$ -	R\$ 8.765.541,21
56	Porto Sudeste do Brasil LTDA	Terminal Marítimo Ilha Madeira	Falta TCCA		R\$ 2.470.874,84	R\$ -	R\$ 2.470.874,84
57	Boechat do Bairro Tratamento de Resíduos, Coleta e Conservação Ltda <sup>6</sup>	CTR Belford Roxo - Boechat	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
58	COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 3 IRMÃOS LTDA	Malibu - 3 Irmãos	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -

<sup>5</sup> A empresa JPL Comercial e Agrícola Ltda foi comprada pela Rio JV Partners, portanto o restante do valor a pagar foi repassado para Rio JV Partners, mantendo-se o mesmo número do TCCA.

<sup>6</sup> Os empreendimentos listados de 57 a 66 já possuem contas abertas por solicitação da DILAM/INEA/RJ e o Funbio aguarda o envio dos TCCAs/RJ, sendo que para esses empreendimentos o valor total a ser depositado não foi informado no momento de solicitação de abertura de conta corrente específica.

59	Petróleo Brasileiro S/A	GASCAB III	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
60	Resende Engenharia e Assessoria LTDA	UTE Resende	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
61	Rio Minas 10 Empreendimentos Imobiliários	Caju - Rio Minas	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
62	Vale Azul Energia S.A	UTE Vale Azul I	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
63	Vale Azul Energia S.A	UTE Vale Azul II	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
64	Vale Azul Energia S.A	UTE Vale Azul III	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
65	Vale S/A	Capacitação do TIG - Vale	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
66	Votorantim Siderúrgica S.A	Votorantim Siderúrgica	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADA DE RECURSOS <sup>7</sup></b>					<b>R\$257.584.889,85</b>	<b>R\$234.181.463,68</b>	<b>R\$ 38.872.525,85</b>

Na tabela a seguir estão descritos empreendimentos que fizeram opção pelo Mecanismo FMA/RJ, mas que tiveram suas contas encerradas até o dia 31 de dezembro de 2015, antes do 1º depósito, conforme solicitado pela DILAM/INEA/RJ.

---

<sup>7</sup> Os recursos a receber serão maiores do que os valores firmados nos TCCAs menos os recursos recebidos devido a correções monetárias, multas e juros.

Empreendedor		Empreendimento	TCCA	Valor do TCCA
1	Aliança S/A - Indústria Naval e Empresa de Navegação	Estaleiro Aliança	Falta TCCA	R\$ -
2	Companhia Siderúrgica Nacional	CSN I	Falta TCCA	R\$ 2.218.350,00
3	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte	BR 493 (DNIT)	04/2010	R\$ 1.481.313,03
4	LLX Minas-Rio Logística Comercial Exportadora S.A.	LLX Minas-Rio	Falta TCCA	R\$ 4.501.000,08
5	LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda	LLX Sudeste	Falta TCCA	R\$ 9.000.000,00
6	Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás	Aeroporto Campos	Falta TCCA	R\$ -
7	Petróleo Brasileiro S/A	Petro TAIC TAIR	16/2008	R\$ 7.000.000,00
8	Prefeitura Municipal de Quissamã	Lagoa Feia - Quissamã	04/2011	R\$ 1.920.626,61
9	Santa Rosa S/A	PCH Santa Rosa	Falta TCCA	R\$ 500.000,00
10	Secretaria do Estado de Obras - SEOBRAS	Setrans Metro Linha 3	Falta TCCA	R\$ 278.150,31
11	Ternium Brasil S/A	Ternium Brasil	Falta TCCA	R\$ -
12	Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	Baia de Guanabara	Falta TCCA	R\$ 1.200.000,00
<b>TOTAL DOS TCCAs</b>				<b>R\$ 28.099.440,03</b>



## 1.2 Instrumento Financeiro Fiduciário

Este instrumento visa a prover sustentabilidade financeira de longo prazo às unidades de conservação que estão sob a gestão do Estado do Rio de Janeiro para a cobertura de parte de seus custos de manutenção, tais como aquisição de bens e serviços necessários à implantação, à gestão, ao monitoramento e à proteção da unidade, por meio da utilização de rendimentos e manutenção do capital principal.

O montante total de recursos financeiros recebido de compensações ambientais para esta carteira e destinado a um Fundo Fiduciário foi de R\$ 20.202.541,16 (vinte milhões, duzentos e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), conforme detalhado na tabela a seguir. Nos empreendimentos listados abaixo foi realizado o aporte integral dos recursos referentes aos seus respectivos TCCAs.

ENTRADAS - FUNDO FIDUCIÁRIO <sup>8</sup>				
	TCCA/RJ	EMPREENDEDOR	DATA	VALOR
1	18/2008	* Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda / Loteamento Industrial Macaé <sup>9</sup>	06/01/2012	R\$ 61.562,34
2	04/2009	* Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda / Aterro de Resíduos - Macaé	06/01/2012	R\$ 68.434,61
3	04/2008	* Brascan SPE RJ 5 S/A / Gleba Norte Brascan	06/01/2012	R\$ 16.159,76
4	07/2010	* Companhia Construtora Vilar Mar/ Vila Mar	06/01/2012	R\$ 68.660,68
5	05/2010	* SPE Dominus 03 Empreendimentos Imobiliários S.A / Condomínio 100	09/01/2012	R\$ 6.340,14
6	06/2007	* SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S.A/Condomínio 200 e 300	09/01/2012	R\$ 20.072,21

<sup>8</sup> Fundo instituído pelo Gestor do FMA e administrado pela Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.

<sup>9</sup> Recursos transferidos para o Fundo Fiduciário em 2012, conforme Deliberação CCA 32/2011, e em 2014, conforme Deliberação CCA 52/2014.

7	07/2010	* SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda/Fazenda Itaipava	09/01/2012	R\$ 9.460,89
8	09/2009	* Pedras Transmissora de Energia S.A/LT EN Elétrica	09/01/2012	R\$ 194.522,49
9	04/2007	Jardel Franco Trindade / Via de Acesso do Complexo Ecoturístico Praia das Pedrinhas	19/01/2012	R\$ 13.100,84
10	20/2008	Brasco Logística Offshore Ltda / Cais Ilha da Conceição	23/01/2012	R\$ 11.915,84
11	15/2007 e 12/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Petro TECAB- Ampliação das Unidades de processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas	27/01/2012	R\$ 10.289.095,30
12	15/2007 e 12/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Petro TECAB- Ampliação das Unidades de processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas	02/02/2012	R\$ 105.302,47
13	01/2007	Energisa Soluções S.A. / PCH São Sebastião do Alto	03/02/2012	R\$ 183.276,44
14	02/2007	Energisa Soluções S.A. / PCH Cajú	03/02/2012	R\$ 204.525,87
15	03/2007	Energisa Soluções S.A. / PCH Santo Antônio	03/02/2012	R\$ 133.017,34
16	10/2007	Luis Antonio Simões Lopes / Loteamento Residencial Fazenda Santa Clara	09/02/2012	R\$ 5.364,74
17	01/2008	UTC Engenharia S.A. UTC Engenharia - Ampliação da Retro Área	01/03/2012	R\$ 28.424,83
18	25/2008	CEG Rio S.A. / Gaseificação Paraíba do Sul /Três Rios	06/03/2012	R\$ 114.499,47
19	24/2008	CEG Rio S.A. / Novas Fontes 1 - Furnas Santa Cruz	06/03/2012	R\$ 192.914,69
20	16/2007 e 13/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas- TECAB	21/03/2012	R\$ 7.372.808,68
21	009/2008 e 005/2012	Forter Participações S.A / ALPHAVILLE URBANISMO Barra da Tijuca	16/10/2012	R\$ 92.309,49
<b>TOTAL 2012</b>				<b>R\$ 19.191.769,12</b>
22	05/2012	GAFISA SPE 77 Empreendimentos Imobiliários Ltda	05/07/2013	R\$ 109.473,68
<b>TOTAL 2013</b>				<b>R\$ 109.473,68</b>

23	02/2009	*Construtora Queiroz Galvão S/A	19/11/2014	R\$	41.385,92
24	07/2011	*Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A	19/11/2014	R\$	75.438,06
25	09/2011	*Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda	19/11/2014	R\$	118.704,01
26	07/2012	*Estaleiro Brasfels Ltda	19/11/2014	R\$	76.543,94
27	10/2013	*Tecnosol Comércio e Serviços Ltda	19/11/2014	R\$	37.312,45
28	16/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Sistema Viário)	19/11/2014	R\$	91.908,79
29	17/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área 4)	19/11/2014	R\$	5.649,35
30	18/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Lotes Áreas 30 e 32)	19/11/2014	R\$	66.760,95
31	19/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área 15 e 16)	19/11/2014	R\$	9.237,04
32	20/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área 33)	19/11/2014	R\$	18.705,56
33	21/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área19 e22)	19/11/2014	R\$	67.374,92
34	15/2013	*Alphaville Urbanismo S.A.	19/11/2014	R\$	42.007,29
35	03/2011	*Primus Ipanema Agropecuária Ltda	20/11/2014	R\$	198.197,31
36	06/2011	*Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.	21/11/2014	R\$	52.072,77
<b>TOTAL 2014</b>				<b>R\$</b>	<b>901.298,36</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS (até 31/12/2015)</b>				<b>R\$</b>	<b>20.202.541,16</b>

### 1.3 Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes

Este mecanismo operacional e financeiro é destinado à captação e à aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental e cuja origem não seja nem de compensação ambiental prevista na Lei do SNUC, nem de doações diretas nacionais ou internacionais.

O montante de recursos total previsto para entrada neste instrumento é de R\$ 18.460.072,97 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta mil, setenta e dois reais e noventa e sete centavos), sendo o total de valores recebidos até 31 de dezembro de 2015 de R\$ 18.602.581,13 (dezoito milhões, seiscentos e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e treze centavos).

As normas e governança para a execução destes recursos são condicionadas à sua origem e estão em fase de elaboração pela SEA/RJ com o apoio do CONVENIADO.

ENTRADAS - OUTRAS FONTES						
Empreendedor	Empreendimento	INÍCIO dos Depósitos no Funbio	Valor	Recursos Recebidos <sup>10</sup>	Recursos a receber	
1 Companhia Siderúrgica Nacional	OF CSN	30/08/2013	R\$ 7.726.250,00	R\$ 7.726.249,98	R\$	-

<sup>10</sup> Os recursos recebidos serão diferentes do que os valores firmados nos TCs devido a correções monetárias, multas, juros ou arrendamento de parcelas.

2	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	OF LLX	05/05/2011	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	OSX Construção Naval S.A.	OF OSX	14/06/2013	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	OF Transcarioca	08/08/2011	R\$ 6.733.822,97	R\$ 6.733.822,97	R\$ -
5	Petróleo Brasileiro S.A.	OF Comperj - PMN das Águas	13/12/2012	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.142.508,18	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADA DE RECURSOS (até 31/12/2015)</b>				<b>R\$ 18.460.072,97</b>	<b>R\$ 18.602.581,13</b>	<b>R\$ -</b>

## 1.4 Instrumento Operacional e Financeiro de Doação

Este mecanismo operacional e financeiro é destinado à aplicação de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e à conservação da biodiversidade, aprovados pelos órgãos ambientais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do Mecanismo FMA/RJ.

Este instrumento ainda não está em operação, pois ainda não houve doações durante a vigência do Convênio 003/2009.

## 1.5 Quadro resumo com as entradas de recursos por ano

No quadro a seguir apresentamos todas as entradas de recursos desde o início do Convênio em 2010 até 31 de dezembro de 2015.

Total de entrada de recursos do Convênio FMA/RJ por ano e por carteira				
Ano	Compensação Ambiental <sup>11</sup>		Fundo Fiduciário	Outras Fontes
2010	R\$	43.761.554,89	R\$ -	R\$ -
2011	R\$	32.694.929,70	R\$ -	R\$ -
2012	R\$	61.747.306,31	R\$ 445.213,12	R\$ -
	-R\$	415.349,07	R\$ 18.746.556,00	
2013	R\$	43.690.731,78	R\$ 109.473,68	R\$ 7.726.249,98
2014	R\$	36.167.118,40	R\$ 901.298,36	R\$ 8.733.822,97
	-R\$	795.355,85		
2015	R\$	17.330.527,52	R\$ -	R\$ 2.142.508,18
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>234.181.463,68</b>	<b>R\$ 20.202.541,16</b>	<b>R\$ 18.602.581,13</b>

<sup>11</sup> Os valores negativos de R\$ 415.349,07 e de R\$ 795.355,85 da carteira de Compensação Ambiental são referentes aos montantes transferidos em 2012 e 2014, respectivamente, para o Fundo Fiduciário com os devidos rendimentos, totalizando R\$ 445.213,12 e R\$ 901.298,36 de entrada no fundo.

## II. Rendimentos dos seguintes Instrumentos:

### 2.1 Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O valor total de rendimentos, considerando os 53 empreendimentos que já realizaram depósitos para o Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, listados na tabela do item 1.1 é de R\$ 49.305.289,86 (quarenta e nove milhões, trezentos e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), desde 30 de março de 2010 até 31 de dezembro de 2015.

<b>RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO MECANISMO FMA/RJ</b>						
<b>Depósito Inicial</b>	<b>Empreendimento e Empreendedor</b>	<b>Número da Conta</b>	<b>Saldo bancário em 31/12/2015</b>	<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Rendimento acumulado de 2010 a dezembro de 2015 <sup>12</sup></b>	
<b>Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental</b>						
abr/2010	FMA CSA 2 (Thyssen) - Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda	21908-8	R\$ 3.971.275,98	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	4.516.119,16
mai/2010	FMA Metro (CRB) - Concessionaria Rio Barra S/A	21883-9	R\$ 2.294.740,06	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	695.838,06
jun/2010	FMA COMPERJ (PETROBRÁS) - Petróleo Brasileiro S/A	21929-0	R\$ 40.439.716,56	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	11.414.895,33
jun/2010	FMA CTR S R (SERB) - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A	21918-5	R\$ 692.829,06	CDB DI	R\$	237.449,58

<sup>12</sup> Não estão sendo debitadas as tarifas bancárias de manutenção das contas e as que por ventura possam ser cobradas por motivos da movimentação da mesma. Os rendimentos das aplicações das contas correntes são líquidos, já descontados o IR (Imposto de Renda) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).



set/2010	FMA Porto do Açú (LLX) - LLX AÇU Operações Portuárias S.A	22129-5	R\$	14.201.778,19	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	4.452.485,73
out/2010	FMA GASDUC III (TAG) - Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	22163-5	R\$	3.974.143,69	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	2.553.028,16
dez/2010	FMA Aeroporto Volta Redonda - Prefeitura Municipal de Volta Redonda	22199-6	R\$	322.313,38	BB LP Corp 600 mil	R\$	90.218,98
dez/2010	FMA Grota Funda Transoeste (PMRJ) - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	22301-8	R\$	925.419,70	CDB DI	R\$	502.920,12
jan/2011	FMA GASJAP - Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	22201-1	R\$	597.623,58	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	342.163,42
mai/2011	FMA Ampliação CTL Sahy (Brascan) - Brascan SPE RJ-5 S.A.	22457-x	R\$	76.262,93	CDB DI	R\$	22.267,08
mai/2011	FMA Via Principal Acesso COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	28607-9	R\$	83.571,98	CDB DI	R\$	223.712,15
ago/2011	FMA Construção Naval Açú (OSX) - OSX Construção Naval S.A.	28628-1	R\$	30.181.208,51	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	8.447.337,30
ago/2011	FMA CTR Itaboraí - Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda	28612-5	R\$	166.079,62	CDB DI	R\$	45.298,18
set/2011	FMA PCH Paracambi (Lightger) - LIGHTGER S.A.	22313-1	R\$	349.064,17	CDB DI	R\$	240.662,07
dez/2011	FMA Obras TECAB - Petróleo Brasileiro S/A	28687-7	R\$	2.423.192,96	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	1.082.468,84
jan/2012	FMA UTE Baixada Fluminense - (Petroleo Brasileiro S/A	28689-3	R\$	778.880,92	CDB DI	R\$	694.060,56
mar/2012	FMA Libra Terminal - Libra Terminal Rio S.A.	23159-2	R\$	1.313.218,48	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	243.662,41

mai/2012	FMA UTE Porto Açú - UTE Porto do Açú Energia S/A	23219- x	R\$	731.807,70	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	164.068,50
jun/2012	FMA Ponta da Areia Mac Laren - Mac Laren Oil Estaleiros Ltda	23280-7	R\$	604.462,55	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	140.871,92
jun/2012	FMA Quitumba - Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A	23403-6	R\$	492.444,77	CDB DI	R\$	127.089,70
jul/2012	FMA Aeroporto Santos Dumont (Infraero) - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont	22382-4	R\$	1.105.793,09	CDB DI	R\$	315.264,12
ago/2012	FMA COMPERJ UHOS - Petróleo Brasileiro S/A	23509-1	R\$	1.832.651,97	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	417.227,47
ago/2012	FMA Implantação Infra. e Urb. Comperj - Petróleo Brasileiro S/A	22405-7	R\$	13.383.170,30	CDB DI	R\$	3.608.600,60
ago/2012	FMA Metro (CRB) II - Concessionaria Rio Barra S/A	23530-X	R\$	9.138.940,93	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	1.516.374,96
set/2012	FMA Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale) - Vale S/A	22406-5	R\$	74.057,69	CDB DI	R\$	105.298,74
nov/2012	FMA Rio JV Partners - Rio JV Partners Participações LTDA	24126-1	R\$	598.909,47	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	88.688,66
nov/2012	FMA TA AR Transpetro - Petrobrás Transporte S.A - Transpetro	28709-1	R\$	414.773,12	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	133.096,99
jan/2013	FMA Presidente Vargas CSN - Companhia Siderúrgica Nacional	24014-1	R\$	914.992,83	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	233.725,65
mar/2013	FMA Itaguaí TECAR CSN II - Companhia Siderúrgica Nacional	22263-1	R\$	3.354.953,21	CDB DI	R\$	835.164,40

mar/2013	FMA Loteum - Loteum Incorporações S.A.	24870-3	R\$	217.094,21	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	28.933,08
jul/2013	FMA Bric Brazilian - Bric Brazilian Intermodal Complex S.A	25470-3	R\$	547.646,73	CDB DI	R\$	98.040,93
jul/2013	FMA CCR Dutra - Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A - CCR Nova Dutra	25496-7	R\$	1.524.960,34	CDB DI	R\$	175.446,24
jul/2013	FMA Multi Car - Multicar Rio Terminal de Veículos S/A	25498-3	R\$	815.258,68	CDB DI	R\$	141.471,10
jul/2013	FMA Multi Rio - Multi-Rio Operações Portuárias S/A	25497-5	R\$	786.457,73	CDB DI	R\$	136.191,59
jul/2013	FMA Transolimpica (PMRJ) - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	25454-1	R\$	7.318.937,10	CDB DI	R\$	1.331.365,01
ago/2013	FMA Terminal Sul LLX - LLX Açú Operações Portuárias S.A	23800-7	R\$	5.898.740,66	CDB DI	R\$	586.183,25
set/2013	FMA Terrestre Submarino Emissário COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	24717-0	R\$	1.922.911,42	CDB DI	R\$	323.349,42
nov/2013	FMA Gasoduto Guapimirim - Petróleo Brasileiro S/A	25499-1	R\$	419.200,10	CDB DI	R\$	66.848,20
Nov/2013	FMA Linha de Transmissão - Petróleo Brasileiro S/A	25343-x	R\$	110.144,20	CDB DI	R\$	19.159,85
nov/2013	FMA Sistema Dutoviário COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	24718-9	R\$	4.760.202,80	CDB DI	R\$	761.140,80
dez/2013	FMA Marina Imperial - Marina Imperial Ltda	26457-1	R\$	77.611,64	CDB DI	R\$	13.839,19
dez/2013	FMA UPGN COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	26402-4	R\$	10.600.668,43	CDB DI	R\$	1.561.053,33

jan/2014	FMA Gasoduto Guapimirim II - Petróleo Brasileiro S/A	25767-2	R\$	599.721,16	CDB DI	R\$	85.200,86
jan/2014	FMA Lot. Búzios Golfe (Agre) - Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A	25789-3	R\$	240.609,50	CDB DI	R\$	28.800,23
out/2014	FMA Dragagem do TESUL - LLX - LLX AÇU Operações Portuárias S.A	27184-5	R\$	2.437.282,66	CDB DI	R\$	147.565,51
nov/2014	FMA UTE Santa Cruz (Furnas) - Furnas Centrais Elétricas S.A.	26778-3	R\$	1.080.556,40	CDB DI	R\$	113.293,72
fev/2015	FMA Readequação TECAM/REDUC - Petróleo Brasileiro S/A	27459-3	R\$	1.831.717,61	CDB DI	R\$	91.298,04
mar/2015	FMA Alphaville São José - São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda	27273-6	R\$	282.132,55	CDB DI	R\$	22.248,58
mar/2015	FMA LT Macaé Campos III Furnas - Furnas Centrais Elétricas S/A	26777-5	R\$	501.595,81	CDB DI	R\$	39.574,92
jun/2015	FMA PCH Rio Preto - Poço Fundo Energia S/A	23.300-5	R\$	63.511,49	CDB DI	R\$	1.791,29
set/2015	FMA GNL Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A	26687-6	R\$	1.738.092,60	CDB DI	R\$	41.247,28
dez/2015	FMA Ampliação Porto Sudeste - Porto Sudeste do Brasil LTDA	28193-X	R\$	413.320,76	CDB DI	R\$	980,56
dez/2015	FMA Expansão Bellavista - Bellavista Empreendimentos Ltda.	27586-7	R\$	104.325,19	CDB DI	R\$	208,04
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>179.730.977,17</b>		<b>R\$</b>	<b>49.305.289,86</b>

## 2.2 Instrumento Financeiro Fiduciário

Para administrar o Fundo Fiduciário, o Funbio conta com o apoio da Comissão de Gestão de Ativos, instituída no âmbito de seu Conselho Deliberativo, e dos serviços da PRAGMA Gestão de Patrimônio Ltda., com a qual tem um contrato para gestão dos seus próprios ativos e dos demais ativos sob a responsabilidade de gestão do Funbio.

Os investimentos dos recursos seguem as políticas propostas pela Comissão de Gestão de Ativos do Funbio e aprovadas pela SEA (Ofício SEA /SSE nº 159/2011 de 06 de dezembro de 2011).

De janeiro de 2012 a dezembro de 2015 o rendimento acumulado foi de R\$ 6.467.375,04 (R\$ 1.873.988,99 em 2012, R\$ 798.388,96 em 2013, R\$ 1.445.723,13 em 2014 e R\$ 2.349.273,96 em 2015). Na tabela a seguir apresentamos o crescimento nominal e real (descontado a inflação) do Fundo Fiduciário ao longo do tempo.

CRESCIMENTO	2012	2013	2014	2015	Acum
NOMINAL	11,40%	-2,00%	4,10%	10,30%	27,50%
REAL	5,40%	-5,80%	-2,20%	-0,40%	-3,30%

Lembramos que o crescimento da carteira considera os impactos das movimentações e da retenção do imposto de renda, enquanto a rentabilidade da carteira é calculada excluindo-se esses fatores.

Em 2012 e em 2015 não ocorreu nenhuma retirada. Em 2013 foram retirados R\$ 567 mil, representando um “*spending rate*” de 2,7%. Este valor é referente ao resgate para o primeiro dispêndio para execução do Fundo, conforme autorização da CCA na 42ª Reunião Ordinária de 11/06/2013, relativo ao Projeto Cartão Vinculado. Em 2014 foram retirados R\$ 900 mil, representando um “*spending rate*” de 3,8%. Este valor é referente ao resgate para o segundo dispêndio para execução do Fundo, conforme autorização da CCA na 53ª Reunião Ordinária de 30/10/2014 e Deliberação 52/14 de 07/11/2014, relativo ao Projeto Cartão Vinculado.

Em 2012 o Fundo Fiduciário recebeu um aporte de R\$ 19.191.769,12; em 2013 o aporte foi de R\$ 109.473,68; em 2014 ocorreu uma transferência para o fundo de R\$ 901.298,36 autorizada pela Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/2014 e em 2015 o fundo não recebeu nenhum recurso.

A seguir temos um resumo da posição do Fundo Fiduciário em 31 de dezembro de 2015:

### Alocação em 31/12/2015

CLASSE DE ATIVO	% da Carteira	Alocação em R\$	
Renda Fixa Low Vol	57,20%	R\$	14.419.735,00
Renda Fixa	19,80%	R\$	4.988.740,00
2/2015Hedge Funds	16,80%	R\$	4.235.012,00
Renda Variável	6,30%	R\$	1.577.007,00
Cts a Pagar/Receber	-0,10%	-R\$	17.375,16
<b>Consolidado</b>	<b>100%</b>	<b>R\$</b>	<b>25.203.198,85</b>

### Rentabilidade em 31/12/2015

CLASSE DE ATIVO	Rentabilidade	BENCHMARK	Ano
Renda Fixa Low Vol	12,90%	CDI	13,20%
Renda Fixa	10,10%	IRF Composto *	10,60%
Hedge Funds	15,60%	IFM	14,30%
Renda Variável	3,60%	IBX	-12,40%
<b>Carteira</b>	<b>12,00%</b>	<b>Benchmark</b>	<b>11,10%</b>
		Inflação IPCA	10,70%
		Poupança	8,20%

\* IMA até 30/05/2014

O "*Benchmark*" pondera os índices de referências locais pela alocação média da faixa esperada de cada classe de ativo, acordadas no mandato<sup>13</sup>.

A tabela a seguir reflete o resumo do Fundo Fiduciário desde o início em 2012:

RESUMO DO FUNDO FIDUCIÁRIO de Jan/12 a Dez/15					
Aportes		Rendimento		Retirada	Total
R\$	20.202.541,16	R\$	6.467.375,04	-R\$ 1.466.717,35	R\$ 25.203.198,85


Em dezembro de 2015 o retorno real acumulado da carteira do Fundo Fiduciário foi próximo de zero. Se considerarmos o patrimônio líquido (descontado o imposto de renda provisionado para pagamento do come cotas), o Retorno Real Líquido do portfólio fechou dezembro em R\$ -160 mil.

Patrimônio Bruto	R\$	25.203.000,00
Valor corr. IPCA	R\$	25.270.000,00
Retorno Real Bruto	-R\$	67.000,00
IR Provisionado	R\$	93.000,00
Retorno Real Liq.	-R\$	160.000,00

<sup>13</sup> Mandato é a estratégia de distribuição dos investimentos em categorias de ativos observando a política de investimentos aprovada (diretrizes gerais).



## Evolução Patrimonial - mai.13 / dez.15

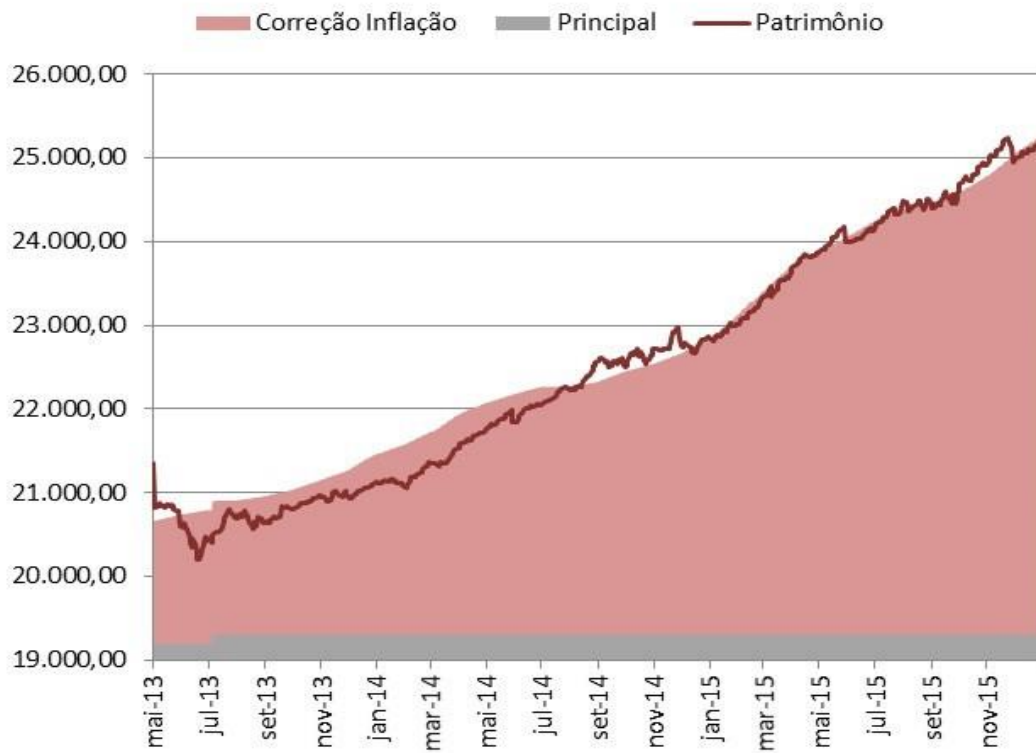

Ainda quanto aos rendimentos provenientes do Instrumento Financeiro Fiduciário, apresentamos abaixo o valor total de rendimentos da conta do Projeto do Fundo Fiduciário - Cartão Vinculado, considerando o recurso da conta operacional do projeto Cartão Vinculado, de R\$ 82.013,48 (Oitenta e dois mil, treze reais e quarenta e oito centavos) até 31 de dezembro de 2015. Esses recursos são utilizados pelo projeto, prioritariamente para o pagamento de despesas bancárias ou outras taxas de serviços e podem, ainda, ser executados pelo próprio projeto.

<b>RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO MECANISMO FMA/RJ</b>					
<b>Depósito Inicial</b>	<b>Empreendimento e Empreendedor</b>	<b>Número da Conta</b>	<b>Saldo bancário em 31/12/2015</b>	<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Rendimento acumulado de 2010 a dezembro de 2015 <sup>14</sup></b>
<b>Conta Operacional do Projeto Fundo Fiduciário</b>					
jul/2013	Cartão Vinculado FF	25738-9	R\$ 211.592,10	CDB DI	R\$ 82.013,48
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 211.592,10</b>		<b>R\$ 82.013,48</b>

---

<sup>14</sup> Não estão sendo debitadas as tarifas bancárias de manutenção das contas e as que por ventura possam ser cobradas por motivos da movimentação da mesma. Os rendimentos das aplicações das contas correntes são líquidos, já descontados o IR (Imposto de Renda) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

## 2.3 Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes

O valor total de rendimentos, considerando os empreendimentos sinalizados no item 1.3, referentes ao Instrumento Financeiro de Outras Fontes é de R\$ 3.692.106,75 (Três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e seis reais e setenta e cinco centavos), até 31 de dezembro de 2015.

<i>RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO MECANISMO FMA/RJ</i>					
<b>Depósito Inicial</b>	<b>Empreendimento e Empreendedor</b>	<b>Número da Conta</b>	<b>Saldo bancário em 31/12/2015</b>	<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Rendimento acumulado de 2010 a dezembro de 2015 <sup>15</sup></b>
<b>Instrumento Financeiro de Outras Fontes</b>					
set/2013	OF CSN - Companhia Siderúrgica Nacional	24144-X	R\$ 9.582.940,65	CDB DI	R\$ 1.856.953,47
jan/2014	OF Transcarioca - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	26715-5	R\$ 8.096.896,87	CDB DI	R\$ 1.363.468,10
fev/2014	OF Comperj - PMN das Águas - Petróleo Brasileiro S/A	26730-9	R\$ 4.613.639,36	CDB DI	R\$ 471.685,18
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 22.293.476,88</b>		<b>R\$ 3.692.106,75</b>

<sup>15</sup> Não estão sendo debitadas as tarifas bancárias de manutenção das contas e as que por ventura possam ser cobradas por motivos da movimentação da mesma. Os rendimentos das aplicações das contas correntes são líquidos, já descontados o IR (Imposto de Renda) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

### **III. Quanto à execução por TCCA, com detalhamento por projetos:**

Nos quadros a seguir é informado o balanço da execução dos recursos alocados nos projetos, pela Câmara de Compensação Ambiental (CCA), em função dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA), firmados entre os empreendedores e a Diretoria de Licenciamento Ambiental DILAM/INEA/RJ.

O detalhamento dos gastos com Regularizações Fundiárias, referentes ao Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária, é apresentado no item 3.26.

**3.1 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para CSA 2 (Thyssen) até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - TCCA 11/2007						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado <sup>16</sup>	Valor a executar	Situação <sup>17</sup>
1	Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - <b>UCC</b>	INEA	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ -	Finalizado
2	Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF</b>	INEA	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ -	Finalizado
3	Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN</b>	INEA	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ -	Finalizado
4	Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - <b>APA Tamoios</b>	INEA	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 06 de 02/06/2008

<sup>16</sup> O detalhamento dos gastos efetuados relacionados aos projetos constam nas prestações de contas enviadas à SEA e INEA durante o Convênio 003/2009.

<sup>17</sup> Projetos Finalizados: os recursos não executados retornam para o saldo livre do empreendimento.

Saldo livre significa permanecer na mesma conta bancária do empreendimento, mas já não mais comprometido com o projeto encerrado, podendo ser alocado em outro projeto aprovado pela CCA.

5	Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - <b>Recategorização REJ</b>	INEA	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ -	Finalizado
6	Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - <b>Proj. Exec. V. Revolta</b>	INEA	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ -	Finalizado
7	Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b>	INEA	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ -	Finalizado
8	Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - <b>Reforma e Obras EEEP</b>	INEA	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ -	Finalizado
9	Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF 2</b>	INEA	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ -	Finalizado
10	Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN 2</b>	INEA	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ -	Finalizado
11	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b>	INEA	R\$ 184.383,06	R\$ 184.383,06	R\$ -	Finalizado

12	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - <b>Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b>	INEA	R\$ 230.000,00	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010
13	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - <b>Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b> 04.15.04.0014	INEA	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ -	Finalizado
14	Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b>	INEA	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ -	Finalizado
15	Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - <b>Cercamento e Sinalização da RBAG</b>	INEA	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ -	Finalizado
16	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - <b>Delimitação de UCs Municipais</b>	SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010
17	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento Pmonte</b>	Prefeitura Municipal de Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010
18	Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - <b>Parna Itatiaia</b>	ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 564.162,04	R\$ 899,66	Aguardando aprovação PC Final
19	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano</b>	INEA	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.531.016,61	R\$ 163.165,45	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 25 de 16/11/2010



20	Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b>	INEA	R\$ 782.903,25	R\$ 770.329,81	R\$ 12.573,44	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 24 de 07/10/2010
21	Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe</b>	INEA	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ -	Finalizado
22	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b>	INEA	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 26 de 13/12/2010
23	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú</b>	SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.855.857,56	R\$ 131.506,11	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 24 de 07/10/2010
24	Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - <b>Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ -	Finalizado
25	Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - <b>Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ -	Finalizado
26	Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - <b>Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ -	Finalizado
27	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b>	INEA	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010

28	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - <b>P M Nova Iguaçu</b>	Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu	R\$ 1.628.773,35	R\$ 239.553,24	R\$ 1.389.220,11	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 09 de 28/08/2008
29	Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - <b>Exec. PNM JUREMA</b>	Prefeitura Municipal de São João de Meriti	R\$ 70.000,00	R\$ 68.250,00	R\$ 1.750,00	Aguardando aprovação PC Final
30	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - <b>Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba</b>	Prefeitura Municipal de Mangaratiba	R\$ 504.390,60	R\$ 66.045,85	R\$ 438.344,75	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
<b>Projetos - Subtotal</b>			<b>R\$ 26.705.386,60</b>	<b>R\$ 23.705.026,09</b>	<b>R\$ 3.030.977,45</b>	
31	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	
32	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	SEA	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ -	
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 39.815.708,91</b>	<b>R\$ 37.068.346,12</b>	<b>R\$ 2.747.362,79</b>	

- Seguem informações adicionais sobre essa tabela:

**Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 13.000.000,00, conforme ATAS da CCA nº 10 e 25, de 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010, respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foram executados na gestão anterior à do Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

**Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA:** Foi alocado o valor de R\$ 535.680,00, conforme ATA da CCA nº 23, de 06 de novembro de 2009, e Deliberação da CCA nº 16, de 03 de dezembro de 2009.

**Projeto UCC:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 3,26 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157, de 14 de julho de 2011.

**Projeto NUREF:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 136.123,14, sendo que R\$ 103.983,92 foram executados. O valor remanescente de R\$ 32.139,22 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

**Projeto RPPN:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 55.819,00, sendo que R\$ 29.458,40 foram executados. O valor remanescente de R\$ 26.360,60 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

**Projeto Recategorização REJ:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.373,00, sendo todo o valor executado. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362, de 13 de dezembro de 2011.

**Projeto Executivo V. Revolta:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 33.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto Exec. Estr. 2 Rios:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.398,16 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A

aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207, de 09 de julho de 2012.

**Projeto Reforma e Obras EEEP:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.068.521,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 258,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257, de 17 de setembro de 2013.

**Projeto NUREF 2:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.059,83 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto RPPN 2:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431,546,75 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.425,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 200,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296, de 05 de setembro de 2012.

**Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 409.145,00 sendo que R\$ 104.700,38 foram executados. O valor remanescente de R\$ 304.444,62 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347, de 26 de agosto de 2014.

**Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foram executados. O valor remanescente de R\$ 259,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225, de 23 de agosto de 2013.

**Projeto PE Cunhambebe:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.740,45 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369, de 20 de dezembro de 2013.

**Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 284.700,00, sendo que R\$ 284.700,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 062/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 221.950,00, sendo que R\$ 221.950,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 063/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 335.150,00, sendo que R\$ 335.150,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 064/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba):** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 215.000,00, sendo que R\$ 184.383,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 30.616,94 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 461/15, de 30 de outubro de 2015.

**Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba):** A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 153.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 215.000,00.

**Exec. Reforma e Const. RBA (Araras):** A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 170.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 230.000,00.

**Parque Estadual do Desengano:** A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, estabeleceu o acréscimo de R\$ 176.301,14 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 2.694.182,06.

**Projeto Obras e Fortalecimento PEIG:** A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 42.000,00 e de R\$ 66.127,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.253.173,75.

**Projeto Obras Rebio Praia do Sul:** A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 142.575,28 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.006.194,51.

**P M Nova Iguaçu:** A Deliberação da CCA nº 33, de 08 de novembro de 2011, estabeleceu o valor total de R\$ 1.628.773,35.

- Os seguintes projetos foram cancelados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto de Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu:** Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203, de 17 de agosto de 2010 e ATA 31º da CCA, de 20 de abril de 2011. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

**Projeto Obras Vale da Revolta:** Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126, de 22 de maio de 2012 e Deliberação CCA nº 35/2012, de 19 de abril de 2012. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 278.378,37, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

**3.2 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para COMPERJ até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) TCCA 03/2010</b>						
<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Valor alocado nos Projetos</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Situação</b>	
<b>1</b> Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande</b>	INEA	R\$ 806.405,13	R\$ 804.583,86	R\$ 1.821,27	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 29 de 07/2011	
<b>2</b> Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - <b>Exec. Trilhas Parques Copa 2014</b>	INEA	R\$ 601.219,98	R\$ 577.637,43	R\$ 23.582,55	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011	
<b>3</b> Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b>	INEA	R\$ 1.696.575,00	R\$ 807.607,93	R\$ 888.967,07	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011	
<b>4</b> Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos UCs do ERJ</b>	SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00	Aguardando aprovação PC Final	
<b>5</b> Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006</b>	INEA	R\$ 5.249.818,47	R\$ 4.850.628,25	R\$ 399.190,22	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012	
<b>6</b> Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Educação Ambiental RJ</b>	INEA	R\$ 3.590.100,00	R\$ 1.348.785,94	R\$ 2.241.314,06	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014	

7	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - <b>Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ</b>	INEA	R\$ 3.482.080,00	R\$ 1.121.195,91	R\$ 2.360.884,09	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
8	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - <b>Gerencia. Proj. e Obras para UCs Estaduais - 2ª fase</b>	INEA	R\$ 2.300.000,00	R\$ 581.495,55	R\$ 1.718.504,45	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2015
9	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - <b>PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase</b>	INEA	R\$ 4.300.000,00	R\$ -	R\$ 4.300.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2014
10	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b>	SEA	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.646.991,59	R\$ 350.497,41	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 51 de 11/09/2014
11	Obras Civis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas</b>	INEA	R\$ 2.426.172,14	R\$ -	R\$ 2.426.172,14	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2016
12	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - <b>Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ</b> 04.15.07.0013	SEA	R\$ 1.565.000,00	R\$ -	R\$ 1.565.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2014
<b>Projetos - Subtotal</b>			<b>R\$ 28.786.069,72</b>	<b>R\$ 10.966.070,80</b>	<b>R\$ 16.275.943,26</b>	
13	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 4.039.790,99	Em andamento
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 38.786.069,72</b>	<b>R\$ 16.926.279,81</b>	<b>R\$ 20.315.734,25</b>	



- Seguem informações adicionais sobre essa tabela:

**Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 conforme ATA da CCA nº 31, de 20 de abril de 2011, e Deliberação da CCA nº 28, de julho de 2011 e aprovado um novo aporte de recurso no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 44/2014, de 02 de janeiro de 2014.

**Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande:** A Deliberação da CCA nº 41, de 20 de agosto de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 134.400,85 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 806.405,13.

**Projeto Obras Infra. PE Concórdia:** A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 989.818,47 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 5.249.818,47.

- O seguinte projeto foi cancelado de acordo com o estabelecido pela CCA:

**Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu:** Este projeto foi cancelado de acordo com a Deliberação da CCA nº 51/2014, de 11 de setembro de 2014. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 229.970,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

**3.3 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para GASDUC III (TAG) até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ GASDUC III (TAG) - TCCA 12/2008</b>					
<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Situação</b>
<b>1</b> Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b>	INEA	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 34 de 13/12/2011
<b>2</b> Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - <b>Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis</b>	Prefeitura Municipal de Petrópolis	R\$ 1.297.349,09	R\$ -	R\$ 1.297.349,09	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 28 de 07/2011
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>		<b>R\$ 6.766.849,09</b>	<b>R\$ 5.453.631,73</b>	<b>R\$ 1.313.217,36</b>	

- Segue informação adicional sobre essa tabela:

**Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ:** A Deliberação da CCA nº 42, de 10 de setembro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 1.093.900,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 5.469.500,00.

**3.4 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP - TCCA 13/2007					
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1 Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - <b>Rebio União - Termo de Reciprocidade (TR) ICMBIO</b>	ICMBio	R\$ 311.778,92	R\$ 311.778,55	R\$ 0,37	Aguardando aprovação PC final
2 Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada ( <i>Leontopithecus chrysomelas</i> ) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - <b>Recintos Micos Cara Dourada</b>	INEA	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	-	Finalizado
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>		<b>R\$ 561.577,26</b>	<b>R\$ 561.576,89</b>	<b>R\$ 0,37</b>	

- Segue informação adicional sobre essa tabela:

**Projeto Recintos Micos Cara Dourada:** A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 39.798,34 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 249.798,34. Todo o valor alocado para este projeto foi executado. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 106/2015, de 09 de abril de 2015.

**3.5 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Grota Funda Transoeste (PMRJ) até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA 08/2010</b>						
<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>		<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Situação</b>
<b>1</b>	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</b>	INEA	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 29 de 07/2011
<b>2</b>	Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - <b>Plano de Manejo PNM Chico Mendes</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 276.112,60	R\$ 269.905,00	R\$ 6.207,60	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012
<b>3</b>	Proposição de um modelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - <b>Novo Modelo Gestão para UCs RJ</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 458.000,00	R\$ -	R\$ 458.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 41 de 20/08/2013
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 2.639.647,38</b>	<b>R\$ 2.146.446,42</b>	<b>R\$ 493.200,96</b>	

**3.6 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Porto do Açú (LLX) até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009					
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	CFR	Valor executado	Valor a executar	Situação
<b>1</b> Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</b>	INEA	R\$ 340.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 175.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011
<b>2</b> Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b>	INEA	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.297.901,97	R\$ 73.192,65	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 27 de 22/12/2010
<b>3</b> Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral - <b>Gerencia. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI</b>	INEA	R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 1.303,94	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011
<b>4</b> Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - <b>RVS Ventania</b>	Prefeitura Municipal de Miracema	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 34 de 13/12/2011
<b>5</b> Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - <b>SERF 3 (NUREF 3)</b>	INEA	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.147.278,75	R\$ 546.660,59	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012

6	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - <b>UPAms PI ERJ</b>	INEA	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 37 de 05/10/2012
7	Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - <b>Proj. Publicação Planos MA</b>	SEA	R\$ 78.000,00	R\$ 45.960,00	R\$ 32.040,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
8	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira</b>	Prefeitura Municipal de Natividade	R\$ 368.446,00	R\$ 81.625,41	R\$ 286.820,59	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 13.849.987,96</b>	<b>R\$ 9.291.199,14</b>	<b>R\$ 4.558.788,82</b>	

- Seguem informações adicionais sobre essa tabela:

**Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba:** A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 473.668,61 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 3.371.094,62.

**Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI:** A Deliberação da CCA nº 40, de 11 de junho de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 1.650.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 3.150.000,00.

**3.7 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Implantação Infra. Urb. Comperj até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA 08/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada</b>	INEA	R\$ 1.664.481,86	R\$ 626.344,46	R\$ 1.038.137,40	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 37 de 05/10/2012
2	Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca</b>	INEA	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
3	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - <b>Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca</b>	INEA	R\$ 950.000,00	R\$ 397.398,18	R\$ 552.601,82	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
4	Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu</b>	INEA	R\$ 150.683,00	R\$ 149.966,32	R\$ 716,68	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
5	Regularização Fundiária das UCs Estaduais - <b>SERF UCs INEA</b>	INEA	R\$ 3.422.090,44	-	R\$ 3.422.090,44	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 49 de 14/07/2014
6	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - <b>RPPN UCs</b>	INEA	R\$ 2.577.741,43		R\$ 2.577.741,43	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 49 de 14/07/2014
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 9.164.996,73</b>	<b>R\$ 1.173.708,96</b>	<b>R\$ 7.991.287,77</b>	

- O seguinte projeto foi cancelado de acordo com o estabelecido pela CCA:

**Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos:** Projeto cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50, de 12 de março de 2013, e com a ATA da CCA nº 41, de 07 de fevereiro de 2013. O valor de previsto para o projeto de R\$ 10.740.000,00 retornou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.



**3.8 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para UTE Baixada Fluminense Petrobras até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobras - TCCA 11/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b>	INEA	R\$ 4.280.805,29	R\$ 3.922.563,38	R\$ 358.241,91	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012
2	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE</b>	INEA	R\$ 204.625,00	R\$ -	R\$ 204.625,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 42 de 10/09/2013
3	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b>	SEA	R\$ 211.861,39	R\$ 64.712,96	R\$ 147.148,43	Em andamento Aprovada pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013 e Deliberação CCA/RJ nº 45 de 04/04/2014
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 4.697.291,68</b>	<b>R\$ 3.987.276,34</b>	<b>R\$ 710.015,34</b>	

- Segue informação adicional sobre essa tabela:

**Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe:** A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 855.805,29 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 4.280.805,29.

**3.9 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Via Principal de Acesso - COMPERJ até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ - TCCA 01/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação	
1 Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - <b>MNM Pedra do Colégio</b>	Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	R\$ -	Finalizado	
2 Mosaicos para a Mata Atlântica - <b>Mosaicos para a Mata Atlântica</b>	SEA	R\$ 950.250,00	R\$ 942.012,70	R\$ 8.237,30	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 37 de 05/10/2012	
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>		<b>R\$ 1.153.788,30</b>	<b>R\$ 1.145.551,00</b>	<b>R\$ 8.237,30</b>		

- Segue informação adicional sobre essa tabela:

**Projeto M N M Pedra do Colégio:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 213.550,00 sendo que R\$ 203.538,30 foram executados. O valor remanescente de R\$ 10.011,70 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEA/SSEEV nº 061, de 16 de setembro de 2014.

**3.10 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Aeroporto Santos Dumont – Infraero até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - Aeroporto Santos Dumont - Infraero - TCCA 13/2009						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral - <b>Piloto Fundo Fiduciário</b>	INEA	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ -	Finalizado
2	Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - <b>Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca</b>	SEA	R\$ 367.226,86	R\$ 367.226,86	R\$ -	Finalizado
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ -</b>	

- Seguem informações adicionais sobre essa tabela:

**Projeto Piloto Fundo Fiduciário:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 390.445,00 sendo que R\$ 338.563,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 51.881,02 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165, de 31 de março de 2014.

**Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 460.000,00 sendo que R\$ 367.226,86 foram executados. O valor remanescente de R\$ 92.773,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo SEA/SSEEV nº 065, de 16 de setembro de 2014.

**3.11 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Construção Naval do Açú (OSX) até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - <b>SERPPN 3 (RPPN 3)</b>	INEA	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.750.583,36	R\$ 154.519,61	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012
2	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - <b>Curso Capacitação Guarda-Parques</b>	INEA	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ -	Finalizado
3	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b>	INEA	R\$ 4.060.000,00	R\$ 2.230.212,51	R\$ 1.829.787,49	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 42 de 10/09/2013
4	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - <b>Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua</b>	Prefeitura de Santo Antônio de Pádua	R\$ 689.276,20	R\$ 122.395,51	R\$ 566.880,69	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
5	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - <b>Ações Implant. PE Lagoa do Açú</b>	INEA	R\$ 1.934.367,00	R\$ 391.573,75	R\$ 1.542.793,25	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
<b>Projetos – Subtotal</b>			<b>R\$ 10.261.355,03</b>	<b>R\$ 6.167.373,99</b>	<b>R\$ 4.093.981,04</b>	

6	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80	Em andamento
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 15.261.355,03</b>	<b>R\$ 9.995.258,19</b>	<b>R\$ 5.266.096,84</b>	

- Seguem informações adicionais sobre essa tabela:

**Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 36, de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação da CCA nº 34, de 13 de dezembro de 2011.

**Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques:** A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 2.000,00 e de R\$ 264.087,21 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.673.087,21. O projeto foi finalizado após a execução de R\$ 1.672.608,86 e o valor remanescente de R\$ 478,35 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375, de 27 de dezembro de 2013.

**Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua:** A Deliberação CCA nº 55, de 26 de maio de 2015, estabeleceu o acréscimo de R\$ 110.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 689.276,20.

**3.12 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - VALE até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale - TCCA 12/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - <b>PNM Curió</b>	Prefeitura do Município de Paracambi	R\$ 135.000,00	R\$ 131.625,00	R\$ 3.375,00	Aguardando aprovação PC final
2	Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos - <b>Remoção de Rebanhos na UCS ERJ</b>	SEA	R\$ 280.800,00	R\$ 278.834,70	R\$ 1.965,30	Aguardando aprovação PC final
3	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	INEA	R\$ 63.233,04	R\$ -	R\$ 63.233,04	Em andamento Aprovada pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/06/2015
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 479.033,04</b>	<b>R\$ 410.459,70</b>	<b>R\$ 68.573,34</b>	

**3.13 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para CTR Itaboraí até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - CTR Itaboraí - TCCA 11/2009						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - <b>RPPN BACCHUS</b>	INEA	R\$ 103.700,00	R\$ -	R\$ 103.700,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 103.700,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 103.700,00</b>	



**3.14 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para OBRAS TECAB até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - OBRAS TECAB - TCCA 08/2011					
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1 Regularização Fundiária	INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.699,12	R\$ 55.300,88	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ (Del. 43) em 28/09/2013
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>		<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.944.699,12</b>	<b>R\$ 55.300,88</b>	

- Segue informação adicional sobre essa tabela:

**Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 45, de 30 de outubro de 2013, e Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013.

**3.15 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Ponta da Areia Mac Laren até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - Ponta da Areia Mac Laren - TCCA 03/2009</b>					
<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Situação</b>
<b>1</b> Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - <b>Apoio à Criação - RESEX Marinha Itaipu</b>	SEA	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	Aguardando aprovação PC final
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>		<b>R\$ 64.897,24</b>	<b>R\$ 62.227,76</b>	<b>R\$ 2.669,48</b>	

**3.16 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Transolímpica até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ Transolimpica (PMRJ) - TCCA 01/2013						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - <b>Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu</b>	INEA	R\$ 150.683,00	R\$ 149.966,32	R\$ 716,68	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 150.683,00</b>	<b>R\$ 149.966,32</b>	<b>R\$ 716,68</b>	

**3.17 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Metro (CRB) até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA - RJ Metro (CRB) - TCCA 01/2010</b>						
<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>		<b>Instituição responsável</b>	<b>Valor alocado nos Projetos</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Situação</b>
<b>1</b>	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - <b>PM e Implant. APA Rio Guandu</b>	INEA	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 1.234.596,00</b>	<b>R\$ 8.024,00</b>	<b>R\$ 1.226.572,00</b>	

**3.18 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para TA AR Transpetro até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA - RJ TA AR Transpetro - TCCA 10/2011</b>						
<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>		<b>Instituição responsável</b>	<b>Valor alocado nos Projetos</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Situação</b>
<b>1</b>	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - <b>Projeto para aquisição de embarcação</b>	INEA	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 606.320,00</b>	<b>R\$ 303.951,56</b>	<b>R\$ 302.368,44</b>	

**3.19 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Itaguaí Tecar até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ Itaguaí Tecar - CSN II - TCCA 15/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Implantação PE Pedra Selada</b>	INEA	R\$ 1.350.000,00	R\$ 514.678,65	R\$ 835.321,35	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014
2	Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - <b>Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá</b>	Prefeitura Municipal de Volta Redonda	R\$ 966.500,00	R\$ -	R\$ 966.500,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
3	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - <b>PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público</b>	ICMBio	R\$ 380.256,14	R\$ 107.244,40	R\$ 273.011,74	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 2.696.756,14</b>	<b>R\$ 621.923,05</b>	<b>R\$ 2.074.833,09</b>	

- Segue informação adicional sobre essa tabela:

**PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público:** A Deliberação da CCA nº 47, de 11 de junho de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 37.204,64 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 380.256,14.

**3.20 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Metro CRB II até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA - RJ Metro CRB II - TCCA 06/2012</b>						
<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>		<b>Instituição responsável</b>	<b>Valor alocado nos Projetos</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Situação</b>
<b>1</b>	Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo - <b>PM PNM Penhasco Dois Irmãos</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 337.141,91	R\$ -	R\$ 337.141,91	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
<b>2</b>	Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - <b>Ações Implant. PE Mendanha</b>	INEA	R\$ 1.798.000,00	R\$ 385.358,45	R\$ 1.412.641,55	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
<b>3</b>	Adequação Ambiental da Estrada Parque Cunhambebe (RJ 149 - subtrecho inserido no Parque Estadual do Cunhambebe - PEC) e Restauração e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural lindeiro a via, contemplando as Ruínas do Saco de Cima, o Bebedouro da Barreira e o Mirante - <b>PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149</b>	INEA	R\$ 3.900.000,00	R\$ -	R\$ 3.900.000,00	Em andamento Aprovada pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2014
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 6.035.141,91</b>	<b>R\$ 385.358,45</b>	<b>R\$ 5.649.783,46</b>	

**3.21 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Presidente Vargas até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA - RJ Presidente Vargas - CSN - TCCA 13/2012</b>						
<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Valor alocado nos Projetos</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Situação</b>	
<b>1</b> Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - <b>Aquisições PE Serra da Concórdia</b>	INEA	R\$ 447.409,51	R\$ 220.197,90	R\$ 227.211,61	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014	
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>		<b>R\$ 447.409,51</b>	<b>R\$ 220.197,90</b>	<b>R\$ 227.211,61</b>		



**3.22 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para PCH Paracambi até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger) - TCCA 28/2008</b>						
<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>		<b>Instituição responsável</b>	<b>Valor alocado nos Projetos</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Situação</b>
<b>1</b>	Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe - Aquisições para a sede</b>	INEA	R\$ 573.201,31	R\$ 421.297,77	R\$ 151.903,54	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 573.201,31</b>	<b>R\$ 421.297,77</b>	<b>R\$ 151.903,54</b>	

**3.23 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para CTR SR (SERB) até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ CTR SR (SERB) - TCCA 02/2010						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - <b>Uniformes Camuflados para o CPAm</b>	SEA	R\$ 303.690,00	R\$ -	R\$ 303.690,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014
2	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	INEA	R\$ 34.7032,77	R\$ -	R\$ 34.7032,77	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/06/2015
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 650.722,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 650.722,77</b>	

**3.24 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Quitumba até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Quitumba - TCCA 04/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFR	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	INEA	R\$ 452.582,26	R\$ -	R\$ 452.582,26	Em andamento Aprovada pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/05/2015
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 452.582,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 452.582,26</b>	

- Segue informação adicional sobre essa tabela:

**Prospecção arqueológica em área destinada à construção de sede para Reserva Ecológica Estadual da Juatinga-Paraty:** Projeto cancelado de acordo com o Ofício INEA/DIBAP/COMBIO nº 249, de 04 de setembro de 2013. O valor previsto para o projeto de R\$ 87.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre, para ser alocado em outros projetos. O projeto em questão será executado diretamente pelo empreendedor.

**3.25 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para UTE Santa Cruz até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ UTE SANTA CRUZ - TCCA 06/2014					
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1 Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	INEA	R\$ 995.519,27	R\$ -	R\$ 995.519,27	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/06/2015
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>		<b>R\$ 995.519,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 995.519,27</b>	

**3.26 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Ampliação CTR SAHY BRASCAN até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ AMPLIAÇÃO CTR SAHY BRASCAN - TCCA 02/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	INEA	R\$ 70.501,09	R\$ -	R\$ 70.501,09	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/06/2015
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 70.501,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 70.501,09</b>	

**3.27 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para UTE Marina Imperial até 31 de dezembro de 2015, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA - RJ UTE MARINA IMPERIAL - TCCA 16/2013</b>						
<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>		<b>Instituição responsável</b>	<b>Valor alocado nos Projetos</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Situação</b>
<b>1</b>	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	INEA	R\$ 71.131,57	R\$ -	R\$ 71.131,57	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/06/2015
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>			<b>R\$ 71.131,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 71.131,57</b>	

### 3.28 Execução relativa ao Projeto Fundo Fiduciário:

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO					
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1 Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos das UCs Estaduais de Proteção Integral - <b>Projeto Fundo Fiduciário</b>	SEA	R\$ 1.466.717,35	R\$ 1.184.306,29	R\$ 282.411,06	Em andamento Aprovado pelas Deliberações CCA/RJ nº 32 de 04/11/2011 e nº 52 de 07/11/2014
<b>TOTAL (até 31/12/2015)</b>		<b>R\$ 1.466.717,35</b>	<b>R\$ 1.184.306,29</b>	<b>R\$ 282.411,06</b>	

### 3.29 Execução relativa à Regularização Fundiária:

Nos quadros a seguir é informado o detalhamento dos gastos com Regularizações Fundiárias por TCCA e por Unidades de Conservação, referente ao Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária aprovada pela CCA/RJ.

#### Por TCCA:

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (RF)		
Unidade de Conservação	Número de Pagamentos Regularizações Fundiárias	Valor total de Pagamento
FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) - TCCA 11/2007		
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	2	R\$ 1.244.681,18
Parque Natural Municipal do Curió - SEA/RJ	1	R\$ 535.680,00
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - INEA	20	R\$ 9.890.639,14
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	44	R\$ 1.437.092,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>67</b>	<b>R\$ 13.108.092,32</b>
FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) - TCCA 03/2010		



Parque Estadual dos Três Picos – INEA	1	R\$	117.516,00
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - INEA	6	R\$	1.062.792,23
Parque Estadual Cunhambebe – INEA	1	R\$	1.100.000,00
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	29	R\$	279.183,85
Parque Estadual Desengano - PED – INEA	1	R\$	2.004.094,83
Parque Estadual Costa do Sol - PECS - INEA	2	R\$	1.396.622,10
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40</b>	<b>R\$</b>	<b>5.960.209,01</b>
<b>FMA/RJ - RJ CONSTRUÇÃO NAVAL AÇU (OSX) - TCCA 05/2011</b>			
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	1	R\$	890.823,00
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	6	R\$	760.031,67
Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB- INEA	2	R\$	600.000,00
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - INEA	1	R\$	5.962,97
Parque Estadual Cunhambebe - INEA	1	R\$	1.571.066,56

<b>SUBTOTAL</b>	<b>11</b>	<b>R\$</b>	<b>3.827.884,20</b>
<b>FMA/RJ - Empreendimento Terminal de Cabiúnas – TECAB (Petrobras) - TCCA 08/2011</b>			
Parque Estadual da Costa do Sol - INEA	1	R\$	3.333.683,30
Parque Estadual Cunhambebe - INEA	1	R\$	1.571.066,56
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - INEA	2	R\$	39.949,26
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4</b>	<b>R\$</b>	<b>4.944.699,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>R\$</b>	<b>27.840.884,65</b>

**Por Unidades de Conservação:**

<b>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (RF)</b>		
<b>Unidade de Conservação</b>	<b>Número de Pagamentos Regularizações Fundiárias</b>	<b>Valor total de Pagamento</b>
Parque Natural Municipal do Curió (SEA)	1	R\$ 535.680,00
Parque Estadual dos Três Picos	4	R\$ 2.253.020,18

Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	29	R\$	10.999.343,60
Parque Estadual da Serra da Tiririca	79	R\$	2.476.307,52
Parque Estadual Cunhambebe	3	R\$	4.242.133,12
Parque Estadual Desengano	1	R\$	2.004.094,83
Parque Estadual Costa do Sol	3	R\$	4.730.305,40
Parque Estadual da Pedra Branca	2	R\$	600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>R\$</b>	<b>27.840.884,65</b>

### 3.30 Situação de contratos firmados para os projetos:

Contratos em andamento durante o ano de 2015:

Consultoria Pessoa Jurídica						
Contratado (a)	Objeto da Contratação	Projeto	Valor	Vigência		FONTE (Recurso de TCCA)
				Início	Fim	
Artesania Consultoria Urbanismo e Arquit	Elaboração do Projetos Executivos de reforma e construção de infraestrutura da Sede da Rebio de Araras	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)	R\$ 144.752,50	05/12/2011	15/03/2016	FMA - CSA2 (Thyssen)
Socioambiental Consultores Associados	Concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de sustentabilidade financeira das UC que a compõem	Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	R\$ 796.358,85	27/02/2012	09/04/2015	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
R&T Arquitetos Associados	Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da RBAG Guaratiba	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	R\$ 184.383,06	12/03/2012	19/07/2015	FMA - CSA2 (Thyssen)

Ocam Consultoria e Projetos Ltda-ME	Elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano	Elaboração de projetos executivos para o Núcleo Babilônia do PE Desengano	R\$ 330.000,00	04/03/2013	30/04/2016	FMA - Porto do Açú (LLX)
Prosplan Obras e Serviços Ltda	Execução de obras civis para implantação da infraestrutura - PE Serra da Concórdia	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia	R\$ 5.225.492,12	08/05/2013	31/01/2016	FMA - COMPERJ (Petrobrás) FMA - COMPERJ (Petrobrás)
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE	Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas	Mosaicos da Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas - Mosaicos para a Mata Atlântica	R\$ 935.250,00	10/06/2013	10/02/2015	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ
DETZEL Consultores Associados S/S	Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes	Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Plano de Manejo PNM Chico Mendes	R\$ 269.905,00	23/08/2013	15/01/2015	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Fábrica Arquitetura Ltda	Elaboração do Projeto Executivo completo para implantação da Unidade de Conservação do Parque natural Municipal do Curió	Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió	R\$ 131.625,00	13/11/2013	30/01/2015	FMA - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)
Venire Construtora Ltda.	Construção de recintos para os micos-leões-da-cara-dourada no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro	Projeto de Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Proj Recintos Micos Cara Dourada	R\$ 249.798,34	19/12/2013	01/01/2015	FMA - GASJAP
Consórcio Costa do Sol	Elaborar proposta de Plano de Manejo para o Parque Estadual da Costa do Sol, proposta de revisão dos Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental de Massambaba, do Pau-Brasil e da Serra de Sapiatiba, e atividades complementares de estruturação física e fundiária destas UCs	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol	R\$ 1.341.310,39	17/03/2014	17/11/2016	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
Detzel Consultores Associados S/S	Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada	R\$ 1.198.900,08	01/08/2014	01/08/2016	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj

Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental Ltda-ME	Elaboração e execução de oficinas de educação ambiental, eventos e cursos, bem como elaboração de conteúdo de cartilhas para educação ambiental no Parque Estadual do Desengano, no Parque Estadual dos Três Picos e no Parque Estadual da Pedra Selada	Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Educação Ambiental RJ	R\$ 1.730.889,02	01/11/2014	24/02/2016	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj
Fábrica Arquitetura Ltda	Elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema	Projeto Executivo de infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema - São João de Meriti - Proj Exec PNM Jurema	R\$ 68.250,00	20/12/2014	16/09/2015	FMA - CSA2 (Thyssen)
2S Studio de Arquitetura	Elaboração de projetos executivos de arquitetura na sede do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu	R\$ 99.597,00	20/12/2014	30/03/2016	FMA - CSA2 (Thyssen)

Fundação Flora de Apoio à Botânica	Elaboração de uma Lista Vermelha de espécies, mapas de áreas prioritárias para conservação, análise da suficiência das Unidades de Conservação e plano de ação e conservação para as espécies da flora endêmicas ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro elaborados	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	R\$ 1.493.333,00	16/01/2015	01/01/2017	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
Saioron Construtora Ltda	Contratação de empresa de construção, reforma e ampliação de edificações para execução de obras na sede do Parque Estadual do Desengano	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase	R\$ 2.597.243,14	15/07/2015	15/07/2016	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)
Saioron Construtora Ltda	Obras de drenagem e pavimentação em trilha de roda em concreto e grama na estrada de acesso ao setor da Morumbeca	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase	R\$ 590.119,90	15/07/2015	15/06/2016	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	Gerenciamento de projetos executivos e execução de obras	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do ERJ – 2ª fase	R\$ 2.114.529,28	04/08/2015	04/08/2016	FMA - COMPERJ (Petrobrás)



Inst. Terra de Preservação Ambiental	Prestação de Serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades Estaduais de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.935.890,51	14/09/2015	14/09/2016	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
R&T Arquitetos Associados Ltda.	Elaboração de projetos executivos para construção de PIC da Garganta do Registro e reforma predial da base operacional do Sítio do Escorrega	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia	R\$ 69.483,00	20/10/2015	07/05/2016	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)
Codex Remote Cien. Esp.Imag.Dig.Ltda EPP	Prestação de serviços de desenvolvimento e implantação de Banco de Dados e Sistema de Gerenciamento de Pesquisa Científica para integrar o Banco de Dados Espaciais do INEA	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3	R\$ 199.510,00	04/11/2015	04/09/2016	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)
Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME	Monitoramento/ Distribuição de material e divulgação/ Fiscalização/ Incorporação da reabilitação ao processo	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ/ FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação fluminenses	R\$ 121.758,09	16/11/2015	16/11/2016	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Casa Cause	Execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 129.506,28	11/12/2015	11/12/2017	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	Execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 664.500,00	11/12/2015	11/12/2017	FMA - Quitumba
Radar PPP - Ltda	Execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora	Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 900.606,00	11/12/2015	11/12/2017	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS
Plantuc Consultoria Socioambiental	Execução de serviços para Técnico Operacional	Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 291.092,69	11/12/2015	11/12/2017	FMA - CTR S R (SERB)

**Consultoria Pessoa Física**

Contratado (a)	Objeto da Contratação	Projeto	Valor	Vigência		FONTE (Recurso de TCCA)
				Início	Fim	
Estefania Zaramella Madeira	Desenvolvimento de projeto gráfico e diagramação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica	Proj Publicação Planos MA	R\$ 18.000,00	02/10/2014	30/04/2015	FMA - Porto do Açú (LLX)
Aline Oliveira Santos	Interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais na Rebio União	Reserva Biológica União	R\$ 27.720,00	31/07/2014	31/05/2015	FMA - GASJAP

#### IV. Quanto ao reembolso Funbio

O Anexo 2 do Convênio nº 003/2009 trata da cobertura de custos do gestor do Mecanismo Financeiro FMA/RJ de acordo com a tabela ali estabelecida. O quadro a seguir discrimina os valores da gestão reembolsados e cobertos por empreendedor (Fonte de Recurso) de abril de 2010 (Convênio celebrado em dezembro de 2009) até junho de 2015 (último reembolso recebido em 2015), no âmbito do convênio SEA/RJ, na forma de reembolso dos custos de operacionalização do gestor do mecanismo financeiro, totalizando R\$ 6.186.275,11 (Seis milhões, cento e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e onze centavos).

<i>Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO</i>						
<b>Número da Prestação de Contas</b>	<b>Período</b>	<b>Valor da Prestação</b>	<b>Valor do Reembolso</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Origem dos recursos Empreendimentos</b>	<b>Data de Recebimento</b>
1	Abril a junho de 2010	R\$ 132.935,82	R\$ 132.935,82	Oficio SEA/SSPPA 22/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	24/09/2010
2	Julho a outubro de 2010	R\$ 219.106,88	R\$ 219.106,88	Oficio SEA/SSPPA 23/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	11/03/2011
3	Novembro de 2010	R\$ 69.875,92	R\$ 69.875,92	Oficio SEA/SSPPA 29/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	17/03/2011
4	Dezembro de 2010	R\$ 61.086,92	R\$ 61.086,92	Oficio SEA/SSPPA 57/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	13/05/2011
5	Janeiro de 2011	R\$ 64.559,50	R\$ 64.559,50	Oficio SEA/SSPPA 76/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	27/07/2011
6	Fev e Mar de 2011	R\$ 111.135,04	R\$ 111.135,04	Oficio SEA/SSPPA 77/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	01/08/2011

7	Abril e maio de 2011	R\$ 116.358,47	R\$ 116.358,47	Oficio SEA/SSPPA 98/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	25/08/2011
8	Junho de 2011	R\$ 55.897,71	R\$ 55.897,71	Oficio SEA/SSPPA 120/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	26/09/2011
9	Julho de 2011	R\$ 64.440,08	R\$ 64.440,08	Oficio SEA/SSPPA 121/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/09/2011
10	Agosto de 2011	R\$ 60.841,93	R\$ 60.841,93	Oficio SEA/SSE 148/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	24/11/2011
11	Setembro de 2011	R\$ 64.600,48	R\$ 64.600,48	Oficio SEA/SSE 164/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	16/12/2011
12	Outubro de 2011	R\$ 51.733,20	R\$ 51.733,20	Oficio SEA/SSE 006/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	12/01/2012
13	Nov e dezembro de 2011	R\$ 151.340,45	R\$ 151.340,45	Oficio SEA/SSE 049/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	10/04/2012
14	Janeiro e fevereiro de 2012	R\$ 192.839,20	R\$ 154.683,85	Oficio SEA/SSE 090/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	19/06/2012
			R\$ 38.155,35	Oficio SEA/SSE 090/2012	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	19/06/2012
15	Março e abril de 2012	R\$ 179.935,12	R\$ 179.935,12	Oficio SEA/SSE 104/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	31/07/2012
16	Maio e junho de 2012	R\$ 205.870,13	R\$ 164.696,10	Oficio SEA/SSE 121/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	21/08/2012
			R\$ 41.174,03	Oficio SEA/SSE 121/2012	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	21/08/2012

17	Julho de 2012	R\$ 84.450,44	R\$ 61.648,82	Oficio SEA/SSE 142/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	26/09/2012
			R\$ 12.667,56	Oficio SEA/SSE 142/2012	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	26/09/2012
			R\$ 10.134,06	Oficio SEA/SSE 142/2012	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	26/09/2012
18	Agosto de 2012	R\$ 81.646,56	R\$ 32.658,62	Oficio SEA/SSE 164/2012	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/10/2012
			R\$ 26.943,38	Oficio SEA/SSE 164/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/10/2012
			R\$ 9.797,58	Oficio SEA/SSE 164/2012	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	29/10/2012
			R\$ 12.246,98	Oficio SEA/SSE 164/2012	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	29/10/2012
19	Setembro de 2012	R\$ 80.011,00	R\$ 44.006,05	Oficio SEA/SSE 202/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	13/12/2012
			R\$ 8.001,10	Oficio SEA/SSE 202/2012	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	13/12/2012
			R\$ 28.003,85	Oficio SEA/SSE 202/2012	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	13/12/2012
20	Outubro e novembro 2012	R\$ 174.802,62	R\$ 24.472,37	Oficio SEA/SSE 018/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	28/01/2013
			R\$ 82.157,23	Oficio SEA/SSE 018/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	28/01/2013
			R\$ 24.472,37	Oficio SEA/SSE 018/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	28/01/2013
			R\$ 43.700,65	Oficio SEA/SSE 018/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	28/01/2013

21	Dezembro de 2012	R\$ 93.333,06	R\$ 37.333,22	Ofício SEA/SSE 031/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	28/02/2013
			R\$ 27.999,92	Ofício SEA/SSE 031/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	28/02/2013
			R\$ 27.999,92	Ofício SEA/SSE 031/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	28/02/2013
22	Janeiro de 2013	R\$ 101.416,14	R\$ 24.339,88	Ofício SEA/SSE 046/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	19/04/2013
			R\$ 31.439,00	Ofício SEA/SSE 046/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	19/04/2013
			R\$ 45.637,26	Ofício SEA/SSE 046/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	19/04/2013
23	Fevereiro de 2013	R\$ 96.568,46	R\$ 15.498,66	Ofício SEA/SSE 057/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	03/06/2013
			R\$ 11.736,34	Ofício SEA/SSE 057/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	03/06/2013
			R\$ 20.347,67	Ofício SEA/SSE 057/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	03/06/2013
			R\$ 38.496,14	Ofício SEA/SSE 057/2013	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	03/06/2013
			R\$ 10.489,65	Ofício SEA/SSE 057/2013	Gasjap - (TCCA 13/2007)	03/06/2013
24	Março de 2013	R\$ 108.523,13	R\$ 30.069,25	Ofício SEA/SSE 067/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/07/2013
			R\$ 19.470,48	Ofício SEA/SSE 067/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	02/07/2013
			R\$ 38.071,88	Ofício SEA/SSE 067/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	02/07/2013
			R\$ 20.911,52	Ofício SEA/SSE 067/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	02/07/2013

25	Abril de 2013	R\$ 119.341,07	R\$ 7.551,56	Ofício SEA/SSE	079/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	29/07/2013
			R\$ 50.829,48	Ofício SEA/SSE	079/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/07/2013
			R\$ 12.781,49	Ofício SEA/SSE	079/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/07/2013
			R\$ 48.178,54	Ofício SEA/SSE	079/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	29/07/2013
26	Maio de 2013	R\$ 116.021,18	R\$ 4.903,06	Ofício SEA/SSE	094/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	18/09/2013
			R\$ 25.787,27	Ofício SEA/SSE	094/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	18/09/2013
			R\$ 9.391,06	Ofício SEA/SSE	094/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/09/2013
			R\$ 22.006,78	Ofício SEA/SSE	094/2013	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	18/09/2013
			R\$ 7.256,16	Ofício SEA/SSE	094/2013	Gasjap - (TCCA 13/2007)	18/09/2013
			R\$ 46.676,85	Ofício SEA/SSE	094/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/09/2013
27	Junho de 2013	R\$ 117.827,50	R\$ 4.316,13	Ofício SEA/SSE	116/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	30/10/2013
			R\$ 3.964,98	Ofício SEA/SSE	116/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	30/10/2013
			R\$ 9.969,24	Ofício SEA/SSE	116/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	30/10/2013



			R\$ 26.604,54	Ofício SEA/SSE	116/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	30/10/2013
			R\$ 30.153,32	Ofício SEA/SSE	116/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	30/10/2013
			R\$ 30.992,36	Ofício SEA/SSE	116/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	30/10/2013
			R\$ 8.871,47	Ofício SEA/SSE	116/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	30/10/2013
			R\$ 2.955,46	Ofício SEA/SSE	116/2013	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	30/10/2013
28	Julho de 2013	R\$ 108.077,31	R\$ 9.983,68	Ofício SEA/SSE	119/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	14/11/2013
			R\$ 5.317,03	Ofício SEA/SSE	119/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	14/11/2013
			R\$ 3.266,87	Ofício SEA/SSE	119/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	14/11/2013
			R\$ 35.289,88	Ofício SEA/SSE	119/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	14/11/2013
			R\$ 26.255,72	Ofício SEA/SSE	119/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	14/11/2013
			R\$ 9.086,87	Ofício SEA/SSE	119/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	14/11/2013
			R\$ 14.324,04	Ofício SEA/SSE	119/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	14/11/2013
			R\$ 4.553,22	Ofício SEA/SSE	119/2013	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	14/11/2013

29	Agosto de 2013	R\$ 106.282,19	R\$ 3.298,49	Ofício SEA/SSE	145/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	02/12/2013
			R\$ 2.546,25	Ofício SEA/SSE	145/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	02/12/2013
			R\$ 2.506,56	Ofício SEA/SSE	145/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/12/2013
			R\$ 22.385,34	Ofício SEA/SSE	145/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	02/12/2013
			R\$ 28.316,28	Ofício SEA/SSE	145/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	02/12/2013
			R\$ 9.430,60	Ofício SEA/SSE	145/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	02/12/2013
			R\$ 3.247,00	Ofício SEA/SSE	145/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	02/12/2013
			R\$ 31.909,36	Ofício SEA/SSE	145/2013	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	02/12/2013
			R\$ 2.642,31	Ofício SEA/SSE	145/2013	Gasjap - (TCCA 13/2007)	02/12/2013
30	Setembro e outubro de 2013	R\$ 220.462,34	R\$ 34.641,31	Ofício SEA/SSE	166/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	23/12/2013
			R\$ 49.569,51	Ofício SEA/SSE	166/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	23/12/2013
			R\$ 70.241,09	Ofício SEA/SSE	166/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	23/12/2013
			R\$ 30.549,93	Ofício SEA/SSE	166/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	23/12/2013
			R\$ 18.679,45	Ofício SEA/SSE	166/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	23/12/2013
			R\$ 16.781,05	Ofício SEA/SSE	166/2013	Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	23/12/2013

31	Novembro e dezembro de 2013	R\$ 201.326,23	R\$ 56.467,89	Ofício SEA/SSEEV 003/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	28/02/2014
			R\$ 96.261,45	Ofício SEA/SSEEV 003/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	28/02/2014
			R\$ 48.596,89	Ofício SEA/SSEEV 003/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	28/02/2014
32	Janeiro e fevereiro de 2014	R\$ 203.614,41	R\$ 15.000,00	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	16/06/2014
			R\$ 59.000,00	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	16/06/2014
			R\$ 56.000,00	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	16/06/2014
			R\$ 15.000,00	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	16/06/2014
			R\$ 28.614,41	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	16/06/2014
			R\$ 30.000,00	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	16/06/2014
33	Março de 2014	R\$ 105.103,43	R\$ 12.470,88	Deliberação CCA nº 50/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	12/08/2014
			R\$ 23.970,17	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	12/08/2014
			R\$ 6.974,57	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	12/08/2014
			R\$ 24.790,16	Deliberação CCA nº 50/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	12/08/2014

			R\$ 19.583,69	Deliberação CCA nº 50/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	12/08/2014
			R\$ 477,22	Deliberação CCA nº 50/2014	Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	12/08/2014
			R\$ 13.009,12	Deliberação CCA nº 50/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	12/08/2014
			R\$ 3.827,62	Deliberação CCA nº 50/2014	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	12/08/2014
34	Abril de 2014	R\$ 110.905,33	R\$ 123,82	Deliberação CCA nº 50/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	12/08/2014
			R\$ 9.826,74	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	12/08/2014
			R\$ 4.795,79	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	12/08/2014
			R\$ 28.026,91	Deliberação CCA nº 50/2014	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	12/08/2014
			R\$ 54.712,36	Deliberação CCA nº 50/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	12/08/2014
			R\$ 7.764,36	Deliberação CCA nº 50/2014	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	12/08/2014
			R\$ 5.655,35	Deliberação CCA nº 50/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	12/08/2014
35	Maio e junho de 2014	R\$ 227.837,69	R\$ 32.720,99	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	19/09/2014
			R\$ 11.612,77	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	19/09/2014

			R\$ 1.140,70	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	18/09/2014
			R\$ 57,77	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	19/09/2014
			R\$ 86.499,57	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	18/09/2014
			R\$ 5.847,66	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	19/09/2014
			R\$ 11.612,77	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	Transolímpica (TCCA 001/2013)	19/09/2014
			R\$ 8.235,10	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	19/09/2014
			R\$ 140,84	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	19/09/2014
			R\$ 17,33	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	19/09/2014
			R\$ 55.573,02	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	19/09/2014
			R\$ 14.379,17	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	19/09/2014
36	Julho de 2014	R\$ 131.871,17	R\$ 17.230,65	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	18/12/2014
			R\$ 48.759,66	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/12/2014
			R\$ 65.880,86	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/12/2014

37	Agosto de 2014	R\$ 130.145,69	R\$ 35.274,37	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	18/12/2014
			R\$ 985,79	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/12/2014
			R\$ 729,36	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/12/2014
			R\$ 7.560,08	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	18/12/2014
			R\$ 50.912,79	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	18/12/2014
			R\$ 5.132,16	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	18/12/2014
			R\$ 29.551,14	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	18/12/2014
38	Setembro de 2014	R\$ 134.186,55	R\$ 17.291,81	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/12/2014
			R\$ 62.432,60	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/12/2014
			R\$ 38.935,26	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	18/12/2014
			R\$ 15.526,88	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	18/12/2014
39	Outubro de 2014	R\$ 139.791,53	R\$ 41.976,10	Parecer Técnico nº 39/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	02/04/2015
			R\$ 10.915,84	Parecer Técnico nº 39/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/04/2015

			R\$ 434,91	Parecer Técnico nº 39/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	02/04/2015
			R\$ 22.818,53	Parecer Técnico nº 39/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	02/04/2015
			R\$ 20.346,49	Parecer Técnico nº 39/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	02/04/2015
			R\$ 425,60	Parecer Técnico nº 39/2015	Transolímpica (TCCA 001/2013)	02/04/2015
			R\$ 25.125,39	Parecer Técnico nº 39/2015	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	02/04/2015
			R\$ 17.748,67	Parecer Técnico nº 39/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	02/04/2015
40	Novembro de 2014	R\$ 112.213,60	R\$ 63.086,49	Parecer Técnico nº 40/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/04/2015
			R\$ 10.032,20	Parecer Técnico nº 40/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	02/04/2015
			R\$ 1.463,76	Parecer Técnico nº 40/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	02/04/2015
			R\$ 1.210,12	Parecer Técnico nº 40/2015	Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	02/04/2015
			R\$ 35.156,04	Parecer Técnico nº 40/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	02/04/2015
			R\$ 1.264,99	Parecer Técnico nº 40/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	02/04/2015
41	Dezembro de 2014	R\$ 110.323,40	R\$ 6.535,36	Parecer Técnico nº 41/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	02/04/2015

			R\$ 14.225,01	Parecer Técnico nº 41/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/04/2015
			R\$ 7.580,73	Parecer Técnico nº 41/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	02/04/2015
			R\$ 590,53	Parecer Técnico nº 41/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	02/04/2015
			R\$ 5.208,24	Parecer Técnico nº 41/2015	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	02/04/2015
			R\$ 449,54	Parecer Técnico nº 41/2015	Metro (CRB) (TCCA 01/2010)	02/04/2015
			R\$ 26.207,74	Parecer Técnico nº 41/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	02/04/2015
			R\$ 17.675,72	Parecer Técnico nº 41/2015	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	02/04/2015
			R\$ 24.510,23	Parecer Técnico nº 41/2015	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	02/04/2015
			R\$ 7.340,30	Parecer Técnico nº 41/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	02/04/2015
42	Janeiro de 2015	R\$ 180.723,05	R\$ 7.899,68	Deliberação CCA nº 55/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	28/05/2015
			R\$ 1.783,65	Deliberação CCA nº 55/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	28/05/2015
			R\$ 31.022,75	Deliberação CCA nº 55/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	28/05/2015
			R\$ 9.577,19	Deliberação CCA nº 55/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	28/05/2015



			R\$ 126.097,08	Deliberação CCA nº 55/2015	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	28/05/2015
			R\$ 4.342,70	Deliberação CCA nº 55/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	28/05/2015
43	Fevereiro de 2015	R\$ 178.773,18	R\$ 14.869,11	Deliberação CCA nº 57/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	29/07/2015
			R\$ 11.223,46	Deliberação CCA nº 57/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/07/2015
			R\$ 3.021,12	Deliberação CCA nº 57/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	29/07/2015
			R\$ 72.814,16	Deliberação CCA nº 57/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	29/07/2015
			R\$ 5.959,52	Deliberação CCA nº 57/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	29/07/2015
			R\$ 1.291,38	Deliberação CCA nº 57/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	29/07/2015
			R\$ 64.497,52	Deliberação CCA nº 57/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	29/07/2015
			R\$ 4.759,73	Deliberação CCA nº 57/2015	Transolímpica (TCCA 001/2013)	29/07/2015
			R\$ 337,18	Deliberação CCA nº 57/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	29/07/2015
44	Março de 2015	R\$ 210.680,93	R\$ 148.878,00	Deliberação CCA nº 57/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/07/2015
			R\$ 264,28	Deliberação CCA nº 57/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	29/07/2015

			R\$ 4.755,71	Deliberação CCA nº 57/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/07/2015
			R\$ 521,92	Deliberação CCA nº 57/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	29/07/2015
			R\$ 34.474,21	Deliberação CCA nº 57/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	29/07/2015
			R\$ 6.598,22	Deliberação CCA nº 57/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	29/07/2015
			R\$ 431,48	Deliberação CCA nº 57/2015	Metro (CRB) (TCCA 01/2010)	29/07/2015
			R\$ 13.574,81	Deliberação CCA nº 57/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	29/07/2015
			R\$ 1.134,80	Deliberação CCA nº 57/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	29/07/2015
			R\$ 47,50	Deliberação CCA nº 57/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	29/07/2015
45	Abril de 2015	R\$ 196.062,68	R\$ 47.825,85	Deliberação CCA nº 57/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/07/2015
			R\$ 66,82	Deliberação CCA nº 57/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	29/07/2015
			R\$ 4.398,55	Deliberação CCA nº 57/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/07/2015
			R\$ 114,34	Deliberação CCA nº 57/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	29/07/2015
			R\$ 66.260,26	Deliberação CCA nº 57/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	29/07/2015

			R\$ 8.602,19	Deliberação CCA nº 57/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	29/07/2015
			R\$ 34.005,99	Deliberação CCA nº 57/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	29/07/2015
			R\$ 2.761,70	Deliberação CCA nº 57/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	29/07/2015
			R\$ 178,07	Deliberação CCA nº 57/2015	TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	29/07/2015
			R\$ 135,55	Deliberação CCA nº 57/2015	Transolímpica (TCCA 001/2013)	29/07/2015
			R\$ 31.498,29	Deliberação CCA nº 57/2015	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	29/07/2015
			R\$ 215,07	Deliberação CCA nº 57/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	29/07/2015
46	Maio de 2015	R\$ 201.714,75	R\$ 71.420,23	Deliberação CCA nº 58/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	13/08/2015
			R\$ 239,10	Deliberação CCA nº 58/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	13/08/2015
			R\$ 5.364,02	Deliberação CCA nº 58/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	13/08/2015
			R\$ 1.142,23	Deliberação CCA nº 58/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	13/08/2015
			R\$ 22.455,43	Deliberação CCA nº 58/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	13/08/2015
			R\$ 69.855,95	Deliberação CCA nº 58/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	13/08/2015

			R\$ 30.348,28	Deliberação CCA nº 58/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	13/08/2015
			R\$ 889,51	Deliberação CCA nº 58/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	13/08/2015
47	Junho de 2015	R\$ 199.681,64	R\$ 119.013,34	Deliberação CCA nº 59/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/09/2015
			R\$ 55,49	Deliberação CCA nº 59/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	29/09/2015
			R\$ 915,83	Deliberação CCA nº 59/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/09/2015
			R\$ 130,55	Deliberação CCA nº 59/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	29/09/2015
			R\$ 12.832,13	Deliberação CCA nº 59/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	29/09/2015
			R\$ 20.553,85	Deliberação CCA nº 59/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	29/09/2015
			R\$ 53,08	Deliberação CCA nº 59/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	29/09/2015
			R\$ 46.127,37	Deliberação CCA nº 59/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	29/09/2015
<b>Valor total reembolso Funbio</b>		<b>R\$ 6.186.275,11</b>	<b>R\$ 6.186.275,11</b>			

No próximo quadro apresentamos o resumo dos reembolsos por TCCA e por ano. Os reembolsos somente são efetuados após autorização expressa da SEA/RJ.

<b>Reembolso Funbio por TCCA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Acumulado até 2015</b>
Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.052,92	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 45.052,92
Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.658,62	R\$ 117.313,62	R\$ 258.800,62	R\$ 435.648,88	R\$ 844.421,74
Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.980,21	R\$ 190.272,58	R\$ 111.621,82	R\$ 452.874,61
CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	R\$132.935,82	R\$ 887.902,93	R\$ 834.986,97	R\$ 239.142,28	R\$ 17.100,82	R\$ 46.054,15	R\$ 2.158.122,97
Gasduc III (TCCA 12/2008)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.751,50	R\$ 92.937,75	R\$ -	R\$ 372.689,25
Gasjap - (TCCA 13/2007)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.388,12	R\$ 44.545,22	R\$ 38.442,11	R\$ 103.375,45
Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 008/2010)	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.795,62	R\$ 60.502,92	R\$ 5.847,66	R\$ 5.208,24	R\$ 181.354,44
Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.612,77	R\$ 231.654,72	R\$ 243.267,49
Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.143,25	R\$ 137.143,25
Metro (CRB) (TCCA 01/2010)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 881,02	R\$ 881,02
PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.774,31	R\$ 99.774,31
Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.781,05	R\$ 477,22	R\$ 1.210,12	R\$ 18.468,39

Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.384,89	R\$ 363.202,38	R\$ 294.118,36	R\$ 160.624,07	R\$ 868.329,70
TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.551,14	R\$ 178,07	R\$ 29.729,21
Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale (TCCA 12/2012)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.037,22	R\$ 143.772,80	R\$ 157.810,02
Transolímpica (TCCA 001/2013)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.612,77	R\$ 5.320,88	R\$ 16.933,65
UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.121,96	R\$ 207.814,36	R\$ 81.133,91	R\$ 334.070,23
Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.418,04	R\$ 51.262,01	R\$ 31.296,41	R\$ 121.976,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$132.935,82</b>	<b>R\$ 887.902,93</b>	<b>R\$ 1.027.826,10</b>	<b>R\$1.362.655,00</b>	<b>R\$1.244.990,50</b>	<b>R\$1.529.964,76</b>	<b>R\$ 6.186.275,11</b>

## V. Quanto à tipologia dos projetos apoiados

Os projetos executados pelo Mecanismo FMA/RJ podem ser divididos nas seguintes tipologias:

Tipologia dos Projetos <sup>18</sup>	Nº de Projetos <sup>19</sup>
Elaboração/implantação de plano de manejo	20
Revisão de Plano de Manejo	2
Projetos executivos para construção ou reforma de infraestrutura	13
Obras (infraestrutura ou reforma)	19
Delimitação de UC	2
Cercamento e sinalização	15
Regularização fundiária	1
Estruturação de um núcleo de regularização fundiária	1
Estruturação de um núcleo de RPPN	1
Fortalecimento e apoio à gestão da UC	55
Fiscalização e combate a incêndios	2
Apoio à criação de UC	2
Educação Ambiental	1

Até 31 de dezembro de 2015 tivemos o total de 71 projetos em andamento e 22 finalizados.

---

<sup>18</sup> Aqui são consideradas tanto as tipologias dos projetos em andamento quanto dos projetos já finalizados.

<sup>19</sup> Existem projetos que abrangem mais de uma tipologia.

## VI. Quanto às UCs apoiadas no Estado do Rio de Janeiro

No âmbito de execução do Mecanismo FMA/RJ, 48 Unidades de Conservação são apoiadas no Estado do Rio de Janeiro, sendo 13 na categoria de Uso Sustentável e 35 na categoria Proteção Integral, totalizando 487.642,45 hectares de áreas protegidas apoiadas pelo Mecanismo.

A tabela a seguir mostra o detalhamento das UCs apoiadas de acordo com a categoria, a área e se é uma UC estadual, municipal ou federal.

Nº	UCs apoiadas	Nível	Área (hectares) <sup>20</sup>	Categoria
1	Parque Nacional da Tijuca	Federal	3.958,47	Proteção Integral
2	Parque Nacional do Itatiaia	Federal	28.084,10	Proteção Integral
3	Reserva Biológica União	Federal	2.922,92	Proteção Integral
4	Estação Ecológica Estadual da Guaxindiba	Estadual	3.260,00	Proteção Integral
5	Parque Estadual Costa do Sol	Estadual	9.841,00	Proteção Integral
6	Parque Estadual Cunhambebe	Estadual	38.053,00	Proteção Integral
7	Parque Estadual da Ilha Grande	Estadual	12.052,00	Proteção Integral
8	Parque Estadual da Lagoa do Açú	Estadual	8.251,00	Proteção Integral
9	Parque Estadual da Pedra Branca	Estadual	12.492,00	Proteção Integral
10	Parque Estadual da Serra da Concórdia	Estadual	804	Proteção Integral

---

<sup>20</sup> As áreas das UCs estaduais foram retiradas da lista, atualizada em julho de 2014, apresentada no site oficial do INEA ([link:http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zzew/mdq4/~edi sp/inea0048153.pdf](http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zzew/mdq4/~edi sp/inea0048153.pdf)), com exceção da Resex Itaipu, que foi extraída do seu decreto de criação, e da RPPN Bacchus, retirada do documento do projeto que a apoia.

Os dados das UCs federais foram obtidos do site oficial do ICMBio (<http://www.icmbio.gov.br/portal/>) e as áreas das UCs municipais foram retiradas dos documentos dos projetos que as apoiam, com exceção do PNM de Petrópolis, que foi extraída de seu decreto de criação.

A Estação Ecológica Estadual do Paraíso foi retirada da lista, pois, de acordo com a Lei nº 6.573 de 31 de outubro de 2013, esta unidade de conservação foi extinta e sua área incorporada ao Parque Estadual dos Três Picos.

O Parque Estadual Marinho do Aventureiro foi recategorizado, pela Lei nº 6.793 de 28 de maio de 2014, como Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), passando a sua área a corresponder, exatamente, à porção marinha da RDS do Aventureiro.



11	Parque Estadual da Serra da Tiririca	Estadual	3.493,00	Proteção Integral
12	Parque Estadual do Desengano	Estadual	21.444,00	Proteção Integral
13	Parque Estadual do Mendanha	Estadual	4.398,00	Proteção Integral
14	Parque Estadual dos Três Picos	Estadual	65.113,00	Proteção Integral
15	Parque Estadual Pedra Selada	Estadual	8.036,00	Proteção Integral
16	Reserva Biológica de Araras	Estadual	3.862,00	Proteção Integral
17	Reserva Biológica de Guaratiba	Estadual	3.360,00	Proteção Integral
18	Reserva Biológica Praia do Sul	Estadual	3.502,00	Proteção Integral
19	Reserva Ecológica da Juatinga	Estadual	9.960,00	Proteção Integral
20	Reserva Particular do Patrimônio Natural Bacchus	Estadual	101,72	Proteção Integral
21	Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu	Estadual	19.508,00	Uso sustentável
22	Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba	Estadual	25.239,00	Uso sustentável
23	Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçú	Estadual	22.109,00	Uso sustentável
24	Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu	Estadual	74.272,00	Uso sustentável
25	Área de Proteção Ambiental Macaé de Cima	Estadual	35.038,00	Uso sustentável
26	Área de Proteção Ambiental Massambaba	Estadual	9.134,00	Uso sustentável
27	Área de Proteção Ambiental Pau-Brasil	Estadual	10.564,00	Uso sustentável
28	Área de Proteção Ambiental Serra de Sapatiba	Estadual	5.967,00	Uso sustentável
29	Área de Proteção Ambiental Tamoios	Estadual	20.636,00	Uso sustentável
30	Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual do Aventureiro	Estadual	1.910,00	Uso sustentável
31	Reserva Extrativista Marinha de Itaipu	Estadual	3.943,28	Uso sustentável
32	Monumento Natural Municipal da Serra de Frecheiras	Municipal	458,11	Proteção Integral

33	Monumento Natural Pão de Açúcar e Urca	Municipal	91,2	Proteção Integral
34	Monumento Natural Pedra do Colégio	Municipal	127,49	Proteção Integral
35	Parque Municipal de Nova Iguaçu	Municipal	1.100,00	Proteção Integral
36	Parque Natural Municipal Chico Mendes	Municipal	43,64	Proteção Integral
37	Parque Natural Municipal da Prainha	Municipal	146,93	Proteção Integral
38	Parque Natural Municipal de Grumari	Municipal	966,32	Proteção Integral
39	Parque Natural Municipal de Petrópolis	Municipal	16,72	Proteção Integral
40	Parque Natural Municipal do Curió	Municipal	1.100,00	Proteção Integral
41	Parque Natural Municipal do Mendanha	Municipal	1.444,86	Proteção Integral
42	Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos	Municipal	39	Proteção Integral
43	Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá	Municipal	211	Proteção Integral
44	Parque Natural Municipal Jardim Jurema	Municipal	3.499,60	Proteção Integral
45	Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis	Municipal	4.397,00	Proteção Integral
46	Refúgio da Vida Silvestre da Ventania	Municipal	2.175,67	Proteção Integral
47	Área de Proteção Ambiental Municipal Preguiça-de-Coleira	Municipal	4.314,70	Uso sustentável
48	Área de Proteção Ambiental da Guaíba – Guaibinha	Municipal	145	Uso sustentável
	<b>TOTAL</b>		<b>487.642,45</b>	

O mapa a seguir apresenta a localização das UCs apoiadas.

## UNIDADES DE CONSERVAÇÃO APOIADAS PELO MECANISMO FMA/RJ

### Federais

- 1 PN de Itatiaia
- 2 PN da Tijuca
- 3 RB União


### Estaduais

- 4 APA do Alto Iguaçú
- 5 APA da Baía do Rio Macacu
- 6 APA de Macaé de Cima
- 7 APA de Mangaratiba
- 8 APA de Massambaba
- 9 APA de Tamolós
- 10 APA do Pau-Brasil
- 11 APA do Rio Guandu
- 12 APA Serra de Sapaitiba
- 13 EEE de Guaxindiba
- 14 EEE do Paraíso
- 15 PE Costa do Sol
- 16 PE da Ilha Grande
- 17 PE da Pedra Branca
- 18 PE da Serra da Concórdia
- 19 PE da Serra da Tiririca
- 20 PE Cunhambebe
- 21 PE do Desengano
- 22 PE dos Três Picos
- 23 PE Lagoa do Açu
- 24 PE Mendanha
- 25 PE Pedra Selada

- 26 RB da Praia do Sul
- 27 RB de Araras
- 28 RB Guaratiba
- 29 RDS do Aventureiro
- 30 Resec da Juatinga
- 31 Resex Marinha de Itaipu
- 32 RPPN Bacchus

### Municipais

- 33 APA Guaíba-Guaibinha
- 34 APA Preguiça de Coleira
- 35 MN dos Morros do Pão de Açúcar e Urca
- 36 MN Pedra do Colégio
- 37 MN Serra de Frecheiras
- 38 PMN do Mendanha
- 39 PNM Chico Mendes
- 40 PNM da Prainha
- 41 PNM de Grumari
- 42 PNM de Nova Iguaçu
- 43 PNM do Curió
- 44 PNM Fazenda Sta Cecília do Ingá
- 45 PNM Jardim Jurena
- 46 PNM Montanhas de Teresópolis
- 47 PNM de Petrópolis
- 48 REVS da Ventania

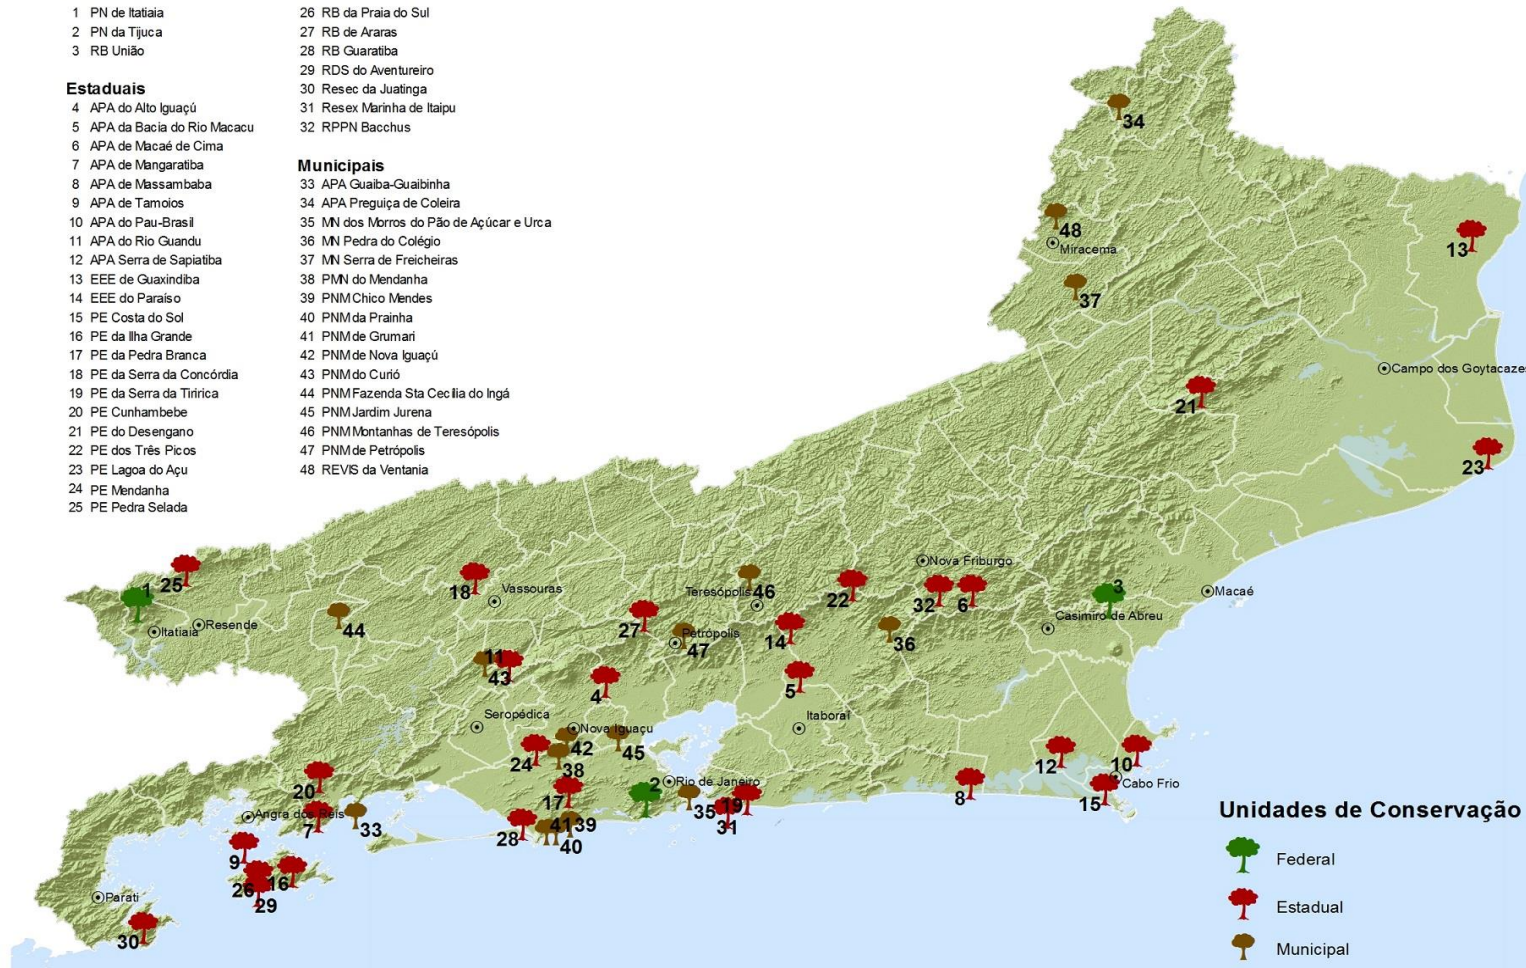

Elaboração e organização do Mapa: Alexandre Ferrazoli Camargo (Unidade de Programas/ Funbio).

## VII. Resumos dos resultados atingidos:

Em relação aos projetos já aprovados no âmbito do Convênio, o valor total alocado em projetos, com recursos da Carteira de Compensação Ambiental e do Fundo Fiduciário, no período de março de 2010 a dezembro de 2015, foi de R\$ 154.501.975,36 (Cento e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), do qual já foi executado o montante de R\$ 98.711.533,02 (Noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta e três reais e dois centavos).

O valor de R\$ 55.790.442,34 (Cinquenta e cinco milhões, setecentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), na coluna “A executar” comporta valores em duas diferentes situações: 1) dependem de demanda do proponente (órgão ambiental beneficiário) para início e 2) outra parte deste valor já é objeto de contratos firmados e ainda em andamento para os pagamentos futuros programados diante da entrega de obras, consultorias e outros, dos projetos alocados. As tabelas a seguir demonstram esses valores.

<b>Empreendimentos<sup>21</sup></b>	<b>Valor total alocado em projetos<sup>22</sup></b>	<b>Executado</b>	<b>A executar</b>	<b>Número de projetos em andamento<sup>23</sup></b>	<b>Número de projetos finalizados</b>
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2009	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ -	0	2

<sup>21</sup> Empreendimentos em que já houve alocação de recursos em projetos. Os valores dos empreendimentos Comperj (Petrobrás), CSA 2 (Thyssen), Construção Naval do Açú (OSX) e OBRAS TECAB incluem os relativos a regularização fundiária.

<sup>22</sup> O valor total alocado em projeto corresponde ao valor total aprovado para os projetos pela CCA menos os recursos dos projetos finalizados que não foram gastos e voltaram para as contas dos empreendedores.

<sup>23</sup> O projeto "Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP" engloba 06 empreendimentos. São eles: Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA 02/2013, CTR SR (SERB) - TCCA 02/2010, Marina Imperial - TCCA 16/2013, Quitumba - TCCA 04/2012, UTE Santa Cruz - TCCA 06/2014 e Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale TCCA 12/2012. Para a coluna de Número de projetos apresentar o total correto, esse projeto foi contabilizado apenas no empreendimento Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA 02/2013.

FMA - RJ Ampliação CTR Sahy Brascan - 02/2011	R\$ 70.501,09	R\$ -	R\$ 70.501,09	1	0
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 38.786.069,72	R\$ 18.470.335,47	R\$ 20.315.734,25	12	0
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 05/2011	R\$ 15.261.355,03	R\$ 9.995.258,19	R\$ 5.266.096,84	4	1
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 39.815.708,91	R\$ 37.068.346,12	R\$ 2.747.362,79	13	17
FMA - RJ CTR Itaboraí - 011/2009	R\$ 103.700,00	R\$ -	R\$ 103.700,00	1	0
FMA - RJ CTR SR (SERB) - 02/2010	R\$ 650.722,77	R\$ -	R\$ 650.722,77	1	0
FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 6.766.849,09	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,36	2	0
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 561.577,26	R\$ 561.576,89	R\$ 0,37	1	1
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 08/2010	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96	3	0
FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 08/2012	R\$ 9.164.996,73	R\$ 1.173.708,96	R\$ 7.991.287,77	6	0
FMA - RJ Itaguaí Tecar - 15/2012	R\$ 2.696.756,14	R\$ 621.923,05	R\$ 2.074.833,09	3	0
FMA - RJ Marina Imperial - 16/2013 <sup>24</sup>	R\$ 71.131,57	R\$ -	R\$ 71.131,57	0	0

<sup>24</sup> O Projeto Modelagem PPP está alocado neste empreendimento, assim como em outros 5. No entanto, ele foi contabilizado apenas no empreendimento Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA 02/2013 para a coluna de Número de projetos apresentar o total correto.

FMA - RJ METRO CRB - 01/2010	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	1	0
FMA - RJ Metro CRB II - 06/2012	R\$ 6.035.141,91	R\$ 385.358,45	R\$ 5.649.783,46	3	0
FMA - RJ Obras Tecab 08/2011 <sup>25</sup>	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.699,12	R\$ 55.300,88	0	0
FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger) - 28/2008	R\$ 573.201,31	R\$ 421.297,77	R\$ 151.903,54	1	0
FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	1	0
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 13.849.987,96	R\$ 9.291.199,14	R\$ 4.558.788,82	8	0
FMA - RJ Presidente Vargas - CSN - 13/2012	R\$ 447.409,51	R\$ 220.197,90	R\$ 227.211,61	1	0
FMA - RJ Quitumba - 04/2012 <sup>26</sup>	R\$ 452.582,26	R\$ -	R\$ 452.582,26	0	0
FMA - RJ TA AR Transpetro - 10/2011	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44	1	0
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 12/2012	R\$ 479.033,04	R\$ 410.459,70	R\$ 68.573,34	2	0
FMA - RJ Transolímpica - 01/2013	R\$ 150.683,00	R\$ 149.966,32	R\$ 716,68	1	0
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 11/2011	R\$ 4.697.291,68	R\$ 3.987.276,34	R\$ 710.015,34	3	0

<sup>25</sup> Os valores apresentados para o empreendimento Obras Tecab (TCCA 08/2011) são referentes apenas à regularização fundiária, portanto, não há nenhum projeto alocado.

<sup>26</sup> O Projeto Modelagem PPP está alocado neste empreendimento, assim como em outros 5. No entanto, ele foi contabilizado apenas no empreendimento Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA 02/2013 para a coluna de Número de projetos apresentar o total correto.

FMA - RJ UTE Santa Cruz - 06/2014 <sup>27</sup>	R\$ 995.519,27	R\$ -	R\$ 995.519,27	0	0
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 01/2011	R\$ 1.153.788,30	R\$ 1.145.551,00	R\$ 8.237,30	1	1
<b><i>SUBTOTAL</i></b>	<b>R\$ 153.035.258,01</b>	<b>R\$ 97.527.226,73</b>	<b>R\$ 55.508.031,28</b>	<b>70</b>	<b>22</b>
<b><i>Instrumento Financeiro Fiduciário</i></b>	<b>Valor total alocado em projetos</b>	<b>Executado</b>	<b>A executar</b>	<b>Número de projetos</b>	<b>Projetos já finalizados</b>
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO	R\$ 1.466.717,35	R\$ 1.184.306,29	R\$ 282.411,06	1	0
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>R\$ 154.501.975,36</b>	<b>R\$ 98.711.533,02</b>	<b>R\$ 55.790.442,34</b>	<b>71</b>	<b>22</b>

---

<sup>27</sup> O Projeto Modelagem PPP está alocado neste empreendimento, assim como em outros 5. No entanto, ele foi contabilizado apenas no empreendimento Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA 02/2013 para a coluna de Número de projetos apresentar o total correto.

<b>Situação do Mecanismo FMA/RJ <sup>28</sup></b>		
<b>Valor total referente aos empreendimentos que fizeram a opção pelo FMA/RJ (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>296.247.503,98</b>
<b>Total Recursos recebidos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>272.986.585,97</b>
<b>Total alocado em projetos (C)<sup>29</sup></b>	<b>R\$</b>	<b>154.501.975,36</b>
<b>Executados (D)</b>	<b>R\$</b>	<b>98.711.533,02</b> Incluindo Projetos finalizados
<b>Em execução (E)</b>	<b>R\$</b>	<b>55.790.442,34</b> Projetos em andamento
<b>Recursos a alocar (de acordo com os recursos já recebidos) (F=B-C)</b>	<b>R\$</b>	<b>118.484.610,61</b> Recursos não demandados pela CCA/RJ para alocar em projetos
<b>Recursos a receber (G)<sup>30</sup></b>	<b>R\$</b>	<b>38.872.525,85</b> Ainda a receber e a alocar em projetos pela CCA/RJ

<sup>28</sup> Inclui recursos destinados ao Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, ao Instrumento Financeiro Fiduciário e ao Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes.

<sup>29</sup> O valor total alocado em projeto (C) corresponde ao valor total aprovado para os projetos pela CCA menos os recursos dos projetos finalizados que não foram gastos e voltaram para as contas dos empreendedores.

<sup>30</sup> Recursos a receber (G) é maior do que o valor total dos empreendimentos que fizeram a opção pelo FMA (A) menos o valor total recebido (B) devido aos rendimentos dos recursos e às correções monetárias.





